
	ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА	
В. № 1304 / 13.04.18	

	ОБЩИНА В. ТЪРНОВО ПОЩА КОД 5800
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА	
09-00-2841 / 13.04.2018	

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Относно : Междинна оценка на Общинския план за развитие на община Велико Търново за периода 2014-2020

Уважаеми общински съветници,

Междинната оценка на Общинския план за развитие на община Велико Търново за периода 2014-2020 /ОПР/ е разработена в съответствие с чл. 33 (1) от Закона за регионалното развитие (ЗРР). Законът изисква изготвянето на обобщена преценка на общинското развитие между 2014 и 2016 година, която да изведе насоките за управление на общината до края на настоящия програмен период.

Междинната оценка обхваща социално-икономическото развитие от гледна точка на изпълнението на ОПР. Оценката разглежда инвестициите по отношение на социалната сфера, икономиката, околната среда, културата, управлението и функционално-пространственото развитие. Тя изследва общинското развитие в периода между 2014 и 2016 година. Фокусът е поставен върху проекти, инициативи и резултати, които са реализирани или са в процес на реализация между разработването на Общинския план за развитие (месец март 2014 г.) и края на 2016 г. Междинната оценка включва оценка на първоначалните резултати от изпълнението; оценка на степента на постигане на съответните цели; оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ.


Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във вр. с чл.33, ал.1 от Закона за регионалното развитие /ЗРР/, предлагам Великотърновски Общински съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във вр. с чл.33, ал.1 от ЗРР, Великотърновски Общински съвет,

Приема Междинната оценка на Общинския план за развитие на община Велико Търново за периода 2014-2020.

Инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Съгласували:

Десислава Йонкова
Директор дирекция „ПОУС“

Изготвил:


Марисла Цонева
Директор д-я „ПП“

До - Велко Търново
13.07.18



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПЕРИОДА 2014-2016

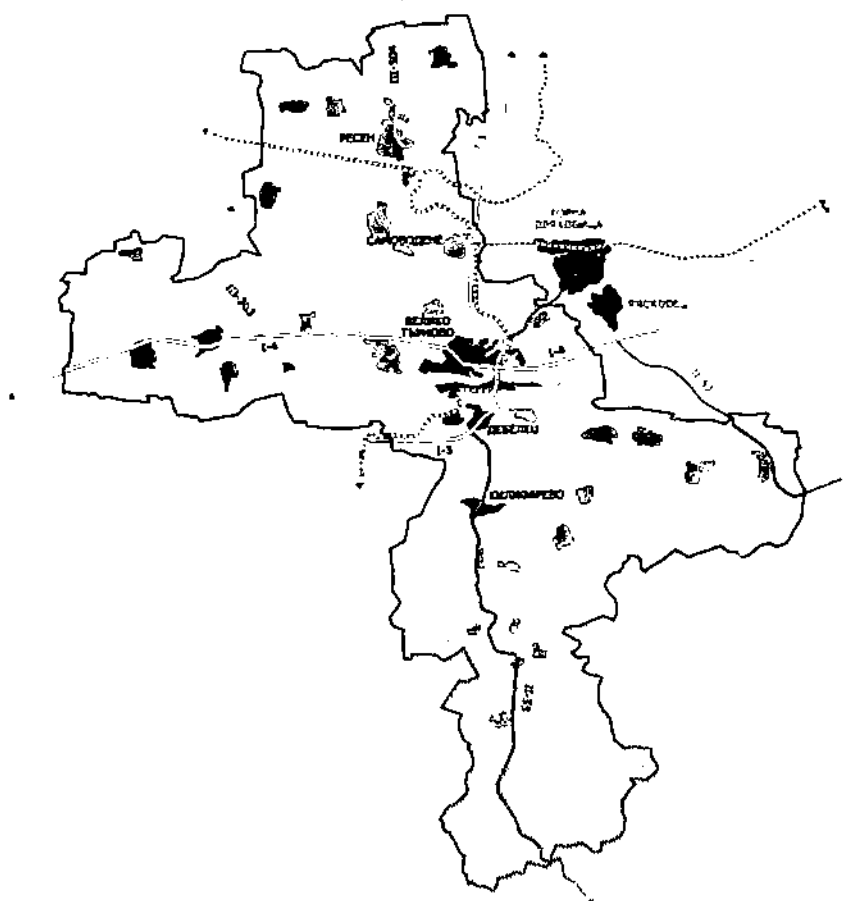

*град Велико Търново,
април 2017 година*

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ВЪВЕДЕНИЕ	4
2. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР ВЕЛИКО ТЪРНОВО	8
2.1. Обща характеристика на изпълнените проекти и инициативи	8
2.2. Отчет на изпълнените и неизпълнени проекти и инициативи	11
3. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОПР	31
3.1. Анализ и оценка на проектите от гледна точка целите и приоритетите в ОПР	31
3.2. Отчитане актуалните стойности на индикаторите от ОПР	37
4. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ	43
4.1. Оценка на ефективността	43
4.2. Анализ и оценка на изразходваните финансови ресурси	44
4.3. Обобщение на организационните ресурси за изпълнение и наблюдение на ОПР ...	49
4.4. Описание на съответствието между разходите и очакваните ползи	49
5. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР	50
5.1. Изводи	50
5.2. Формулиране на препоръки	51

ФИГУРИ

<i>Фигура 1. Процес по разработването, наблюдението и оценката на ОПР</i>	6
<i>Фигура 2. Структура на Междинната оценка</i>	7
<i>Фигура 3. Общо изпълнение на ОПР</i>	9
<i>Фигура 4. Изпълнение спрямо финансовите цели за 2016 и 2020 г.</i>	34
<i>Фигура 5. Изпълнение по приоритетни области и категории проекти/инициативи</i>	34
<i>Фигура 6. Ефективност на изпълнение по приоритетни области</i>	43
<i>Фигура 7. Разпределение на финансовите ресурси по източници</i>	46
<i>Фигура 8. Препоръки за изпълнение и наблюдение на ОПР</i>	53

ТАБЛИЦИ

<i>Таблица 1. Приоритетни области на ОПР</i>	8
<i>Таблица 2. Общо изпълнение на ОПР</i>	10
<i>Таблица 3. Обзор на проектите и инициативите</i>	11
<i>Таблица 4. Степен на изпълнение на ОПР</i>	33
<i>Таблица 5. Алтернативна таблица за степента на изпълнение на ОПР</i>	36
<i>Таблица 6. Индикатори за въздействие</i>	37
<i>Таблица 7. Индикатори за резултат</i>	39
<i>Таблица 8. Степен на изпълнение по приоритетни области и финансови източници</i>	48

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Междинната оценка на Общинския план за развитие на община Велико Търново е разработена в съответствие с чл. 33 (1) от Закона за регионалното развитие (ЗРР). Законът изисква изготвянето на обобщена преценка на общинското развитие между 2014 и 2016 година, която да изведе насоките за управление на общината до края на настоящия програмен период.

Цели

Разработването на Междинната оценка (МО) е ориентирано към постигането на следните цели и подцели:

- (1) Систематизиране и оценка на резултатите от изпълнението на ОПР в периода 2014-2016 г.;
- (2) Формулиране на обосновани препоръки за:
 - (2.1) актуализиране съдържанието на ОПР за остатъка от периода до 2020 г.;
 - (2.2) необходимите действия на администрацията за по-нататъшното изпълнение и наблюдение на ОПР;
 - (2.3) подобряване на действията по развитието на партньорства и осигуряване на информация във връзка с изпълнението на ОПР.

Обект

Документът разглежда територията на община Велико Търново, включително строителните граници и землищата на всички населени места. Територията на община Велико Търново е специфична комбинация от трите града Велико Търново, Дебелец и Килифарево (т. нар. триградие) и други 86 населени места, от които 26% са обезлюдени. Спецификата се допълва от контрастите между населените места в равнинната и старопланинската част на общината.

Предмет

Предмет на разработката е многостранното развитие на община Велико Търново, свързано с изпълнението на проекти и инициативи с принос към стратегията и програмата за реализация на ОПР. Докато общинският план анализира и оценява състоянието и тенденциите на развитие в общината, Междинната оценка обхваща социално-икономическото развитие от гледна точка на изпълнението на ОПР. Оценката разглежда инвестициите по отношение на социалната сфера, икономиката, околната среда, културата, управлението и функционално-пространственото развитие.

Направените анализи акцентират върху проектните дейности и не разглеждат резултатите от изпълнението на основните и регулярни дейности на общинската администрация.

Отчетен период

Междинната оценка изследва общинското развитие в периода между 2014 и 2016 година. Фокусът е поставен върху проекти, инициативи и резултати, които са реализирани или са в процес на реализация между разработването на Общинския план за развитие (месец март 2014 г.) и края на 2016 г. Проекти, които са изпълнявани преди изготвянето на ОПР и в този

смисъл са част от рамката на Общинския план за периода 2007-2013 г., не са отчетени в настоящия документ.

Процес по разработването, наблюдението и оценката на ОПР

ОПР на Велико Търново е разработен в началото на 2014 година със задължителната структура от ЗРР. Обширният социално-икономически анализ е обобщен в кратък SWOT анализ, който заедно с резултатите от публични дискусии и анкети извежда аргументите за стратегията на ОПР. Нейната структура включва визия, разгърната в четири стратегически цели и шест приоритетни области. Визията и целите изразяват желаното бъдещо състояние на общината, докато приоритетните области представят необходимите усилия на общинската администрация и нейните партньори за постигането на това състояние. Формулирането на стратегията се основава на т. нар. „интегриран подход“, при който отделните приоритетни области не са дефинирани като ограничен сектор, а като комплекс от допълващи се теми. По идентичен начин, отделните приоритети и техните проекти създават съвместни резултати и продукти в търсенето на обща добавена стойност за общината. Приоритетните области включват мерки и конкретни проекти, като проектите са остойностени и обобщени в индикативната финансова таблица на ОПР. Неразделна част от документа са и инструментите за неговото наблюдение и оценка, включително планирани индикатори и порядък от действия. Важна роля сред тях заема разработването на Междинната оценка.

Междинната оценка е нормативно планирана за средата на програмния период – 2017 г. Нейната роля е да анализира и оцени изпълнението на общинския план в първата половина от неговия период на действие, след което да формулира необходимите препоръки за корекции през следващите години. Значението на Междинната оценка е свързано с две главни направления:

- (1) оптимизиране съдържанието и изпълнението на ОПР до края на програмния период;
- (2) осигуряване на основа за изготвянето на Последваща оценка и на ОПР 2021-2027.

Последващата оценка следва да се изготви с натрупване от 2014 г., тоест да включва и резултатите от Междинната оценка. По този начин констатациите на настоящия документ са неразделна част от общата оценка на общинското управление между 2014 и 2020 г. Според процеса по разработването, наблюдението и оценката на ОПР, Последващата оценка ще се изготвя през 2021 г., когато ОПР за периода 2021-2027 г. вече ще бъде разработен и ще се изпълнява. При тази последователност, констатациите на **Междинната оценка** ще бъдат основа за **стратегическото планиране през следващия програмен период**.

Фигура 1. Процес по разработването, наблюдението и оценката на ОПР



Структура

Междинната оценка включва четири елемента, дефинирани от чл. 33 (2) на ЗРР:

- (1) оценка на първоначалните резултати от изпълнението на общинския план за развитие (ОПР);
- (2) оценка на степента на постигане на целите на ОПР;
- (3) оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
- (4) изводи и препоръки за изпълнението на ОПР.

Първите три елемента са свързани с анализ и оценка на различните аспекти от изпълнението на ОПР, докато финалният включва предложения за промени в плана или в начините за неговото приложение. Първият елемент е свързан с общ преглед на проектите и инициативите с принос към плана – реализирани или в процес на реализация в рамките на отчетния период. На този етап са систематизирани различни проекти и инициативи и се определя тяхната принадлежност към приоритетните области. Първата преценка завършва с идентифициране на неизпълнени ключови проекти и мерки, които не са подплатени с конкретни реализации. Вторият компонент оценява степента в изпълнението на целите и приоритетните области, като надгражда оценката на първоначалните резултати. Стойностите на систематизираните проекти и инициативи са обобщени в обща финансова оценка за изпълнението на ОПР. В този елемент са сравнени актуалните и целевите стойности на индикаторите от ОПР. Преценката на ефективността и ефикасността на изпълнението се аргументира от съотношението между направените разходи и постигнатите ползи в рамките на целите и приоритетните области на ОПР. Този трети компонент синтезира информацията за проектите и индикаторите от предните части и добавя обзор на предприетите действия

по изпълнението и наблюдението на ОПР – основна предпоставка за ефикасност и ефективност в управлението.


Четвъртият елемент отразява най-важните констатации на МО и техните причини. Изводите са ориентирани спрямо трите основни теми в оценката:

- (1) проекти и инициативи;
- (2) индикатори;
- (3) действия по изпълнението и наблюдението на плана.

Конкретните препоръки са базирани на изводите и са разделени в две групи:

- (1) препоръки относно съдържанието на ОПР, включително необходимостта от актуализация;
- (2) препоръки за усъвършенстване на процесите по изпълнението и наблюдението на общинския план.

Фигура 2. Структура на Междинната оценка

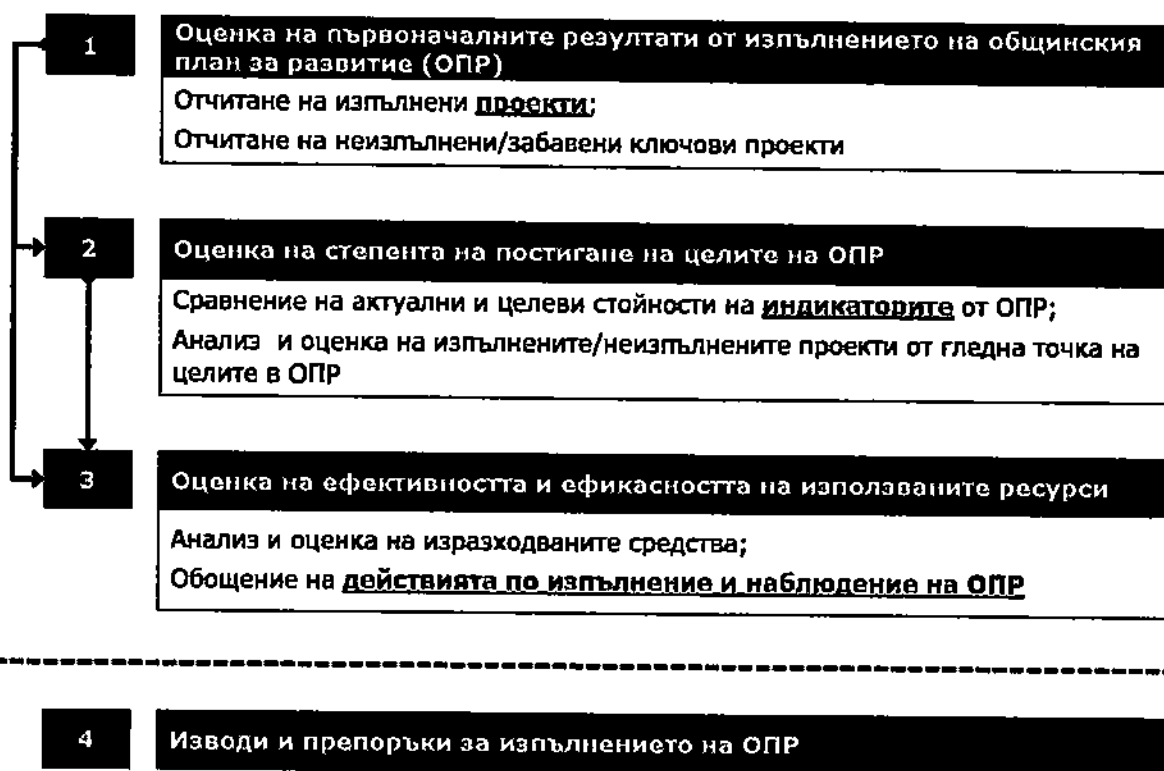

2. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР ВЕЛИКО ТЪРНОВО

2.1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ПРОЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ

Оценката на първоначалните резултати се основава на списък с проектите в община Велико Търново, разработен и попълнен за целите на Междинната оценка, отчети за изпълнението на Мандатната програма на кмета на общината за 2014-2016 г., отчети за изпълнението на Инвестиционната програма (отчитане на капиталовите разходи) за 2014-2016 г. и обобщение на частни проекти и инвестиции с отношение към ОПР. Основните източници на информация са допълнени с по-детайлно проучване на единични проекти с оглед точно определяне на тяхното съответствие с приоритетните области и мерки на общинския план. Обхванати са четири категории проекти и инициативи:

- (1) проекти и инициативи, които са реализирани или в процес на реализация и с висока степен на съответствие спрямо проектите от Програмата за реализация на ОПР;
- (2) проекти и инициативи, които са реализирани или в процес на реализация, не са включени в Програмата за реализация, но имат принос към мерките на плана;
- (3) оценени проектни предложения с предстояща реализация;
- (4) разработени проектни предложения в процес на оценка.

Последните две категории са свързани с бъдещи или потенциални реализации, които отговарят на мерките от приоритетните области на плана. Въпреки че при последната категория няма увереност за резултат към настоящия момент, настоящата Междинна оценка ги разглежда като неразделна част от усилията и предприетите действия за развитие.

Принос на Междинната оценка е систематизирането на всички разгледани проекти и инициативи, заедно с посочване на техните основни характеристики. Пълният списък на проектите е част от структурата на МО и е представен в Приложение №1. Списък с проектите в община Велико Търново. Тук е направен обзор на резултатите от гледна точка на тяхната принадлежност и насоченост към шестте приоритетни области на плана:

Таблица 1. Приоритетни области на ОПР


Приоритетни области	Обхват
1. Градове и фокуси на растеж	Транспортна инфраструктура и свързаност; Индустриални зони; Публични открити пространства (пешеходни пространства, градини, спортни и детски площадки) и сгради; Научно-изследователска дейност; Градски маркетинг
2. Села и периферни територии	Осигуряване на финансови ресурси; Транспортна инфраструктура и свързаност; Водоснабдяване; Публични открити пространства и сгради; Социални дейности; Културен живот
3. Равни възможности	Социална и здравна инфраструктури; Социално включване; Осигуряване на заетост; Образователна

	инфраструктура; „Учене през целия живот”
4. Ресурси и продукция	Канализационна система; Нарушени територии; Горски територии; Енергийна ефективност; Привличане на частни инвестиции и инициативи; Общинска собственост
5. Наследство и туризъм	Културно наследство и архитектурни ансамбли; Крайбрежие на река Янтра; Обновени пространства за културни дейности; Туристически маршрути; Природно наследство
6. Управление, партньорства и връзки	Електронно управление и ГИС платформа; Партньорски модел за взимане на решения и изпълнение на проекти; Диалог между администрация и общественост; Междубщински партньорства; Клъстери

Четири категории проекти и инициативи достигат общо 280 броя за отчетния период (март 2014-2016 г.). От тях, 257 са с фиксирана финансова стойност, докато останалите представляват инициативи, за които не е възможно да бъде определен точен бюджет. Общите характеристики на отчетените реализации са следните:

- (1) общото финансово изпълнение достига 91 067 900 лв;
- (2) средната стойност на проектите с бюджет се равнява на 354 350 лв;
- (3) 55 проекта са на стойност под 10 хил. лв;
- (4) 115 проекта са в групата на стойностите между 10 000 и 100 000 лв;
- (5) 66 проекта са в групата на стойностите между 100 000 и 1 000 000 лв;
- (6) 21 проекта са със стойност над 1 000 000 лв.

Фигура 3. Общо изпълнение на ОПР

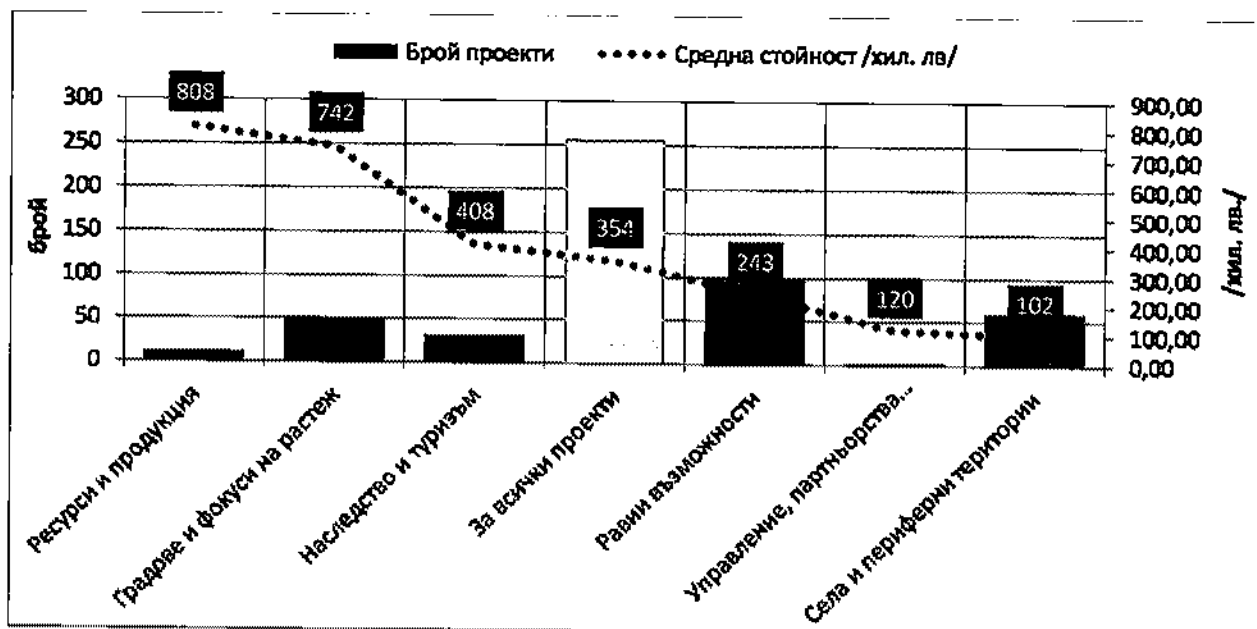

Най-много проекти и инициативи са проследени в приоритетна област „Равни възможности“, която съсредоточава усилията за подобряване на социалната сфера, здравеопазването и образованието. Средната стойност на проектите с финансов параметър достига 242 850 лв. Средната стойност, в комбинация с наличието на значителни по размер проекти за обновяване на социална и образователна инфраструктура показва, че голяма част от реализациите представляват т. нар. „меки проекти“.

Подобренията на градските пространства и функции до момента се материализират от общо 53 проекта и инициативи, а 51 от тях формират бюджет от над 37 819 000 лв. и средна стойност от 741 550 лв. Обяснението на високата стойност е свързано с обемът скъпи инвестиции за доизграждане и реновиране на градските инфраструктури.

Приоритет „Ресурси и продукция“ с общо 12 остойностени проекта и инициативи се отличава с най-високата средна стойност – 807 580 лв.

Област „Наследство и туризъм“ е представена от множество инициативи, които в голямата си част са без остойностен бюджет. Такива примери са реализирането на инициативи в областта на културата и подходи за популяризиране на местните и регионални туристически продукти. Средната стойност за 32 отчетени бройки е 408 160 лв., като се отличават високите разходи за провеждане на културни събития на открито и закрито.

Развитието на селата е подкрепено с голям брой интервенции, като средната стойност на 60 проекта е 101 590 лв., явяващи се и най-ниският резултат по този показател. Причините са свързани с голямото количество частични ремонтни дейности на публични сгради и улици с ограничен бюджет.

Приоритетната област за управлението е с най-ниска концентрация на проекти и инициативи със съответстваща обща сума от 359 000 лв – малко над средната стойност за всички проекти и инициативи.

Таблица 2. Общо изпълнение на ОПР

Приоритетна област	Обща стойност /хил. лв/	Брой проекти с точен бюджет	Средна стойност /хил. лв/	Проекти и инициативи без бюджет
Градове и фокуси на растеж	37 819,00	51	741,55	2
Села и периферни територии	6 095,50	60	101,59	1
Равни възможности	24 042,40	99	242,85	5
Ресурси и продукция	9 691,00	12	807,58	1
Наследство и туризъм	13 061,00	32	408,16	11
Управление, партньорства и връзки	359,00	3	119,67	3
Общо	91 067,90	257	354,35	23

В Таблица 3 е представен обзор на проектите и инициативите в община Велико Търново през отчетния период, заедно с неизпълнените до момента мерки и проекти, включени в Програмата за реализация на ОПР. Структурата на представянето е по приоритетни области и мерки.

2.2. ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТЕ И НЕИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ

Таблица 3. Обзор на проектите и инициативите

Мярка от ОПР	Отчетени проекти и инициативи	Неосъществени проекти и инициативи към края на 2016 г.
1. Градове и фокуси на растеж		
<p>Мярка 1.1. Подобряване състоянието на градската транспортна инфраструктура и осигуряване на добра свързаност с релубликанската пътна мрежа и жп гарите</p>	<p>Най-големият дял от отчетената работа допринася за подобряване на градската техническа транспортна инфраструктура. Ежегодно се разпределят средства за комплексна реконструкция на улици или частичен ремонт на тротоари, пътни настилки или осветление. Най-много обекти са реализирани в град Велико Търново. Сред реализациите се откроява и обновената важна връзка между Дебелец – жп гара Дебелец – В. Търново.</p>	<p>Обновяване на транспортна инфраструктура в град Килифарево; Проекти/части от проекти, произлизащи от ИПГВР на град Велико Търново;</p>
<p>Мярка 1.2. Обновяване на индустриалните зони с подобряване на инфраструктурите и обслужващите пространства;</p>	<p>През отчетния период е направено приоритизиране на обекти от ИПГВР на град Велико Търново, които следва да получат финансиране от ПО1 на ОПРР. В последствие е разработено детайлно проектно предложение за подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона, което към днешна дата е утвърдено от УО на ОПРР. Успешното подаване на предложението защитава 2 000 000 лв. за изпълнението на мярка 1.2.</p> <p>Освен усилията на общинска администрация, поредица частни инициативи индиректно допринасят към конкурентоспособността на зоните. През 2016 г. са одобрени 9 проектни предложения по ОПИК за подобряване на капацитета на 8 производствени структури в град Велико Търново и още една в град Дебелец</p> <p>Договорената БФП достига 4 094 000 лв., докато частното съфинансиране – 3 215 000 лв.</p>	<p>Проекти/части от проекти, произлизащи от ИПГВР на град Велико Търново;</p>
<p>Мярка 1.3. Обособяване на подходящи терени за складови и</p>		<p>Не са били налице условия за реализация на дейности по мярката;</p>

Марка от ОПР	Отчетени проекти и инициативи	Неосъществени проекти и инициативи към края на 2016 г.
логистични дейности, и насърчаване предприемачеството в отрасъл транспорт и складови дейности;		
Марка 1.4. Осигуряване на нови публични пространства и общественозначими функции чрез регенерация и адаптация на съществуващи сгради и прилежащата им среда (Старото военно училище);	<p>Към момента е разработен ПУП-ПРЗ Нов градски център на гр. В. Търново, с което се поставя устройствената основа за последваща регенерация на Старото военно училище. ПУП-ПРЗ е с обхват ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Христо Ботев“, Южен пътен възел и пътя Русе-Стара Загора. Концепцията на плана предвижда единна структура от различни сгради и открити пространства предназначени изцяло за обществени функции – административни, обществено-обслужващи, спорт и атракции. Регенерацията на Старото военно училище е защитена като приоритет за Община Велико Търново с включването на проект „Изграждане и оборудване на военен музей, нова библиотека, младежки арт център, културно - информационен център, музей на фотографията и експозиционен център в Старото военно училище (Фаза 1)“ в Инвестиционната програма на град Велико Търново по ПО1 на ОПРР. Предвидената комбинация от безвъзмездна финансова помощ и финансови инструменти ще осигури финансов ресурс в периода 2017-2019 година.</p> <p>В допълнение са осигурени инвестиции за егални ремонти на ДКС „Васил Левски“.</p>	
Марка 1.5. Поетално и приоритетно обновяване на публични пространства, основни инфраструктури и важни обществени сгради в зоните за интегрирано	<p>От разработената във връзка с ПО1 на ОПРР Инвестиционна програма промълиза и проектното предложение за постигане на привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново. Предложението е оценено и е подписано споразумение за реализация на проекта между УО на ОПРР и</p>	Проекти, произлизащи от ИПГВР на град Велико Търново;

Мярка от ОПР	Отчетени проекти и инициативи	Неосъществени проекти и инициативи към края на 2016 г.
градско възстановяване и развитие;	Община Велико Търново. Реализацията ще доведе до обновяването на публични пространства в старата градска част и в жилищни комплекси, с което ще се допринесе за представянето на впечатляващото културно наследство и за доразвитие на неговата социална и икономическа роля.	
Мярка 1.6. Обновяване на съществуващите и равножертно разпределение на нови пространства за спорт и рекреация в градската среда;	Дейностите, насочени към осигуряването на по-качествени възможности за градски отдиш формират съществен дял от отчета за изпълнението на ОПР в частта градско развитие. Освен интервенциите по обекти като стадион „Ивайло“, ДКС „Васил Левски“ и многофункционалната зала на СОУ „Емилиан Станев“, в общината са направени инвестиции за спортни площадки и осигуряване на достъпен интернет в градските публични пространства (съществуващи и новозградени паркове/междублокови пространства).	Изграждане на комбинирана спортна сграда в град Дебелец; Частично неизпълнение на проекта за ДКС „Васил Левски“; Проекти/части от проекти, произлизащи от ИПГВР на град Велико Търново;
Мярка 1.7. Увеличаване на пешеходните площи и връзки за подобрена пешеходна достъпност и привлекателни подходи до значимите културни ценности;	Обекти от проектното предложение за постигане на привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново са пешеходни пространства и връзки.	Проекти/части от проекти, произлизащи от ИПГВР на град Велико Търново;
Мярка 1.8. Подготвяне и прилагане на регламенти за строителство, реконструкция, допустими функции и рекламни дейности в историческите части на град Велико Търново;	Съхраняването на специфичния архитектурен образ в историческите части на град Велико Търново е водещ приоритет в общинската политика през последните два управленски мандата. Като част от структурата на общинска администрация функционира звено „Културно наследство“, което отговаря за коректно и своевременно съгласуване на инвестиционни проекти съгласно Закона за културното наследство. През 2016 г. е утвърден силюетен план, който уточнява допустимите намеси по културни	

Мярка от ОПР	Отчетени проекти и инициативи	Неосъществени проекти и инициативи към края на 2016 г.
	ценности от улиците „Стефан Стамболов“ и „Велчо Джамджията“. Същевременно, в партньорство между общинската администрация, частни собственици и експерти се осигуряват нужните организационни предпоставки и инвестиции за опазване на архитектурните ансамбли в града.	
Мярка 1.9. Засилване ролята на университетите в управлението и развитието на община Велико Търново;		Не са били налице условия за реализация на дейности по мярката;
Мярка 1.10. Подсилване на университетската научно-изследователска дейност ориентирана към създаването на местна икономика на знанието;	Мярката е подкрепена от два частни проекта по ОПИК, насочени към внедряването на информационно-комуникационни системи и подходи в производствените процеси.	Изграждане на подходяща база и партньорски модели, включително център за компетентност и център за върхови постижения; Проекти/части от проекти, произлизащи от ИПГВР на град Велико Търново;
Мярка 1.11. Рекламираме на община Велико Търново като национален център за растеж и подходящо място за живеене, работа, образование и бизнес инициатива.	През целия отчетен период, Община Велико Търново работи в посока провеждане на събития, участие на форуми и изложения за популяризиране на общината като място за инвестиции и туризъм. Регулярно се реализират кампании за рекламиране и маркетинг на община Велико Търново.	
2. Села и периферни територии		
Мярка 2.1. Прилагане на устойчива общинска политика за съхраняване на селата, формиране на партньорства и мобилизиране на организационни и финансови	Община Велико Търново се отличава с въведената практика за ежегодното финансиране на проекти по фонд „Инициативи на местните общности“. Фондът е ориентиран към подобряване на публични сгради и техните енергийни характеристики, както и на улици и площи. Подобна практика има значителен принос към	

Мярка от ОПР	Отчетени проекти и инициативи	Неосъществени проекти и инициативи към края на 2016 г.
ресурси;	осигуряването и мобилизирането на ресурси за съхраняване на търновските села.	Не са били налице условия за реализация на дейности по мярката;
Мярка 2.2. Стимулиране на селското развитие с привличане на частни инвестиции в сферата на земеделието, туризма и връзките между тях;		Не са били налице условия за реализация на дейности по мярката;
Мярка 2.3. Осигуряване на качествено водоснабдяване в общинските села;		Не са били налице условия за реализация на дейности по мярката;
Мярка 2.4. Осигуряване на по-добра свързаност, изграждане на нови и рехабилитация на стари улици в общинските села;	<p>Голям брой от проектите с принадлежност към приоритетна област „Села и периферни територии“ са свързани с възстановителни работи на общински пътища и пътни съоръжения. Основен източник на финансиране в тази посока са средства от централния бюджет.</p> <p>През 2014, 2015 и 2016 година са финансирани и реконструкции на улици в населените места, извън Фонд „Инициативи на местните общности“. От общата стойност 846 000 лв., 635 000 произлизат от приватизация на Община Велико Търново, което показва стремежът за допълване на ресурсите за развитието на селата.</p>	<p>Реконструкция и възстановяване на общински път 1-5 - Никополс - Иструм (MTR 1013) от км.0+000 до км. 2+024;</p> <p>Частично неизпълнение на проектите за изграждане на нови и рехабилитация на стари улици по села;</p>
Мярка 2.5. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административни, образователни, здравни и социални сгради;	<p>Изпълнението на мярката е представено от ремонтни дейности на публични сгради с различно предназначение – здравни служби, социални домове, комбинирани сгради. Разнообразието на интервенциите включва ремонт на покривни конструкции, отоплителни системи, дограма, както и закупуване на оборудване. Изпълненото се ограничава до частични ремонти и липса на проекти за цялостно обновяване на сградите.</p>	<p>Неизпълнени проекти/части от проекти за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сгради общинска собственост</p>

Мярка от ОПР	Отчетени проекти и инициативи	Неосъществени проекти и инициативи към края на 2016 г.
Мярка 2.6. Благоустройство на публични пространства (площади, градини, зелени площи) и осигуряване на повече места за отдих;	Направлението е представено от ремонти на детски площадки и площади.	Изграждане/обновяване на спортни съоръжения в селата Беляковец, Пчелище, Ресен, Присово; Обновяване на площадите в Ресен и Беляковец;
Мярка 2.7. Трансформация на неизползваеми училищни и други обществени сгради за предоставяне на социални, здравни и културни услуги;	Община Велико Търново е кандидатствала с проектно предложение „Умения за бъдещето в трансграничния регион – модел за сътрудничество между Велико Търново и Александрия“ по Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ с цел изграждане и оборудване на „Училищен център за учебни практики“ – с. Беляковец. Предложението произлиза от проект П2.53 „Реконструкция на сградата на бившето училище в социална инфраструктура (за възрастни или деца) - с. Беляковец“ от Програмата за реализация на ОПР.	
Мярка 2.8. Привличане на частни ресурси за изграждане на туристическа инфраструктура в селата със значими природни и исторически дадености;		Не са били налице условия за реализация на дейности по мярката;
Мярка 2.9. Обезпечаване на селското население със здравеопазване и социални услуги, включително чрез обособяване на групи села с леснодостъпен водещ обслужващ център;	Отчетът на изпълнението на Мярка 2.5 допринася и за настоящата мярка. Не е проследено приложението на модел за обособяване на водещи обслужващи центрове на групи от села.	Не са налице проекти за реконструкция на здравни и социални обекти по села;

Мярка от ОПР

Отчетени проекти и инициативи

Неосъществени проекти и инициативи
към края на 2016 г.

<p>Мярка 2.10. Осигуряване на разнообразни възможности за културен живот в селата, приоритетно чрез стимулиране на читалищната дейност;</p>	<p>Община Велико Търново се отличава с разнообразен и непрекъснато обогатяван културен календар. Значителна част от събитията в календара се домакинстват от общинските читалища, включително и тези в селата. Читалищата организират различни инициативи и събития, свързани с местния фолклор, честване на празници и дати и насърчаване на любителските изкуства.</p>	
<p>Мярка 2.11. Осигуряване на предпоставки и реклама за стимулиране на селското стопанство;</p>	<p>Отличава се наложената практика за развитие на минипазари за продажба на местна продукция от зеленчукопроизводители и търговци в селата Ресен, Велчево, Балван и градовете Дебелец и Килифарево.</p>	
<p>Мярка 2.12. Оптимално използване потенциала на земеделските територии, вкл. чрез увеличаване на площите с трайни насаждения и лозя;</p>	<p>По данни на ОПР, Делът на земеделските земи от територията на община Велико Търново е около 54%. Използването на земеделските земи в общината се регулира от Общия устройствен план, който дефинира конкретни условия и възможни параметри за промяна на предназначението за земеделски земи. Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се разпределят между регистрирани животновъди при ясни процедури съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на годишна основа.</p>	
<p>Мярка 2.13. Обноваване на промишлените територии и стопанските дворове на селата;</p>	<p>Два частни проекта с финансовата подкрепа на ОПИК създават принос към икономическата активност в села от общината. Проектите са насочени към оптимизиране на производствения капацитет и подобряване качествата на продукцията.</p>	
<p>Мярка 2.14. Популяризиране на рекреационните ресурси на селата от периферните старопланински</p>		<p>Не са били налице условия за реализация на дейности по мярката;</p>

Марка от ОПР територии;	Отчетени проекти и инициативи	Неосъществени проекти и инициативи към края на 2016 г.
<p>Марка 2.15. Насърчаване развитието на бизокемелие, пчеларство и рибовъдство;</p> <p>Марка 2.16. Привличане на частни инвестиции за обновяване на селски къщи и адаптирането им като къщи за гости.</p>	<p>Община Велико Търново насърчава развитието на пчеларството с утвърдената практика за преференциално предоставяне на общински терени за разполагане на пчелини.</p>	<p>Не са били налице условия за реализация на дейности по мярката;</p>
<p>3. Равни възможности</p>		
<p>Марка 3.1. Оптимизиране на системата за здравеопазване чрез инвестиции в здравната инфраструктура и гарантиране достъпа до здравно обслужване за всички социални групи и за всички населени места;</p>	<p>През отчетния период продължават усилията на общинска администрация за подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето за децата и семействата. Темата е заложена в два проекта с финансиране по ОПРЧР – „Бъдеще за всяко дете“, „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“ и Програма „СИНДИ“ – здрави деца в здрави семейства“.</p> <p>Регулярно се осигурява публично финансиране за обновления в материалната база на детски ясли, ДМК и на здравни кабинети в училищата.</p>	
<p>Марка 3.2. Обновяване на социалната инфраструктура в населените места;</p>	<p>Капиталовите разходи за социална инфраструктура през последните три години са насочени към обновяване на сградите, обзавеждането и оборудването на обекти като Домашен социален патронаж, Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост и Дом за стари хора „Венета Ботева“ в град Велико Търново.</p>	<p>Частично неизпълнение на предвидените инвестиции за Домашен социален патронаж, гр. Дебелец</p>

Мярка от ОПР	Отчетени проекти и инициативи	Неосъществени проекти и инициативи към края на 2016 г.
<p>Мярка 3.3. Изграждане на липсващата инфраструктура за институционализация на социалните грижи;</p>	<p>Отношение към настоящата мярка имат и отбелязаните проекти по Мярка 2.5. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административни, образователни, здравни и социални сгради в селата.</p> <p>Община Велико Търново прилага последователна политика по модела за „социална грижа в общността“ още от предходния програмен период. През последните три години допълнително е изграден Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост в град Велико Търново, а в момента се подготвя проект за адаптация на помещениия, част от административната сграда на Дом за стари хора „Венета Ботева“, в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания. Най-значителната инвестиция е свързана с одобрения проект „Изграждане на Кризисен център за лица“ на стойност 2 169 000 лв., част от Инвестиционната програма по ПО1 на ОПРР.</p> <p>През отчетния период се звърши и изграждането на 3 бр. Центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи с/ без увреждания в град Велико Търново по ОПРР и се стартира предоставяне на социалната услуга по ОПРЧР по проект „Бъдеще за всяко дете“. През 2014 г. в град Велико Търново се разкри Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения с капацитет 30 места.</p>	<p>Проекти/части от проекти, произлизащи от ИПГВР на град Велико Търново.</p>
<p>Мярка 3.4. Продължаване на инициативите за социално включване, достоен живот и пълноценна заетост на групите в</p>	<p>Община Велико Търново работи по редица проекти за социално включване на различни целеви групи с разнородни нужди. Защитени са проекти „Нови възможности за грижа“, „Подкрепа за независим живот“ и „Приеми ме – 2015“ по ОПРЧР. Отличават се големият брой проекти за образователна интеграция на деца от</p>	<p>Изграждане на социална услуга "Защитено жилище" за лица с психични разстройства в град Велико Търново;</p> <p>Проекти/части от проекти, произлизащи от</p>

Марка от ОПР	Отчетени проекти и инициативи	Неосъществени проекти и инициативи към края на 2016 г.
<p>неравносвойно положение;</p> <p>Марка 3.5. Осигуряване на възможности за заетост на младежи, безработни лица и групи в неравносвойно положение, насърчаване на социалните предприятия;</p>	<p>етническите малцинства, в които активно участват общинските училища.</p> <p>Към момента са вече реализирани или в процес на реализация значителен обем проекти с различни източници на финансиране - ОПРЧР, национални и регионални програми. Освен проектите на Община Велико Търново като „Обучения и заетост за младите хора“, „От социални помощи към осигуряване на заетост“ и др., частният сектор също допринася със свои проекти по ОПРЧР за разкриване на нови работни места.</p>	<p>ИПГВР на град Велико Търново, вкл. 3 броя защитени жилища.</p> <p>Осигуряване на нови възможности за чиракуване и стажуване;</p> <p>Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни лица.</p>
<p>Марка 3.6. Подсилване на връзките между предоставянето на грижи в общността и осигуряването на възможности за заетост на безработни лица;</p>	<p>Активността по отношение на мерки 3.5 и 3.6 надграждат опитите за единна и координирана социална и икономическа интеграция на хора в неравносвойно положение.</p>	
<p>Марка 3.7. Обновяване на образователната инфраструктура и подобряване на качеството и привлекателността на професионалното образование;</p>	<p>Обновяването на образователната инфраструктура традиционно формира едно от най-големите разходни пера на общинската инвестиционна програма за капиталови разходи. През изминалите три години разходите се разпределят за цялостно внедряване на мерки за енергийна ефективност, частични ремонти на помещения, отоплителни или ВиК системи, благоустрояване на дворове и площадки. Неразделна част от модернизирването на образователни обекти е подмяната на наличното оборудване. Отличава се и последователността във въвеждането на информационни и комуникационни технологии в образователни обекти, вкл. закупуване на оборудване и програмни продукти. Основен източник на финансиране са собствените средства на общината, но при активно използване на възможности като</p>	<p>Ремонт на спортни площадки в ПМГ "В. Друмев" и Езикова гимназия "Проф. Д-р Асен Златаров";</p> <p>Ремонт на санитарни възли на ОУ "Д. Благоев - гр. В. Търново;</p> <p>Частично неизпълнение на предвидените инвестиции за реновиране и подобряване енергийната ефективност на ЦДГ "Надежда", гр. Килифарево и ЦДГ "Пламъче" - гр. Дебелец;</p> <p>Проекти/части от проекти, произлизащи от ИПГВР на град Велико Търново.</p>

Мярка от ОПР	Отчетени проекти и инициативи	Неосъществени проекти и инициативи към края на 2016 г.
	<p>Националния доверителен екофонд, ПУДОС, Еразъм +, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.</p> <p>Неразделна част от Инвестиционната програма по ПО1 на ОПР е проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“. През 2016 година успешно са изпълнени изискванията за гарантиране на над 8 000 000 за инвестиции в училища и детски градини.</p>	
<p>Мярка 3.8. Прилагане на метода „учене през целия живот“ за повишаване на образователното равнище и квалификацията на възрастни лица.</p>	<p>Мярката се изпълнява чрез проекти и инициативи, свързани основно с преквалификацията на училищния персонал.</p>	<p>Проекти/части от проекти, произлизащи от ИПТВР на град Велико Търново.</p>
<p>4. Ресурси и продукция</p>		
<p>Мярка 4.1. Осигуряване на ресурси за обновяване и изграждане на липсащите елементи на системите за събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води;</p>	<p>Мярката е представена от предпроектни проучвания и проектиране на елементи от системите за управление на отпадъчните води.</p>	<p>Не са били налице условия за реализация на инфраструктурни проекти по мярката, включително интегриран проект за воден цикъл на гр.Велико Търново – II част, проекти за изграждане, разширяване и реконструкция на ВиК мрежа в градовете Дебелец и Килифарево, проекти за канализация на селата Самоводене, Шемшево и Леденик;</p>
<p>Мярка 4.2. Рекултивация и определяне на подходящи нови функции на нарушени територии</p>	<p>През 2015 г. са закрити и рекултивирани депата за битови отпадъци в Дебелец и Килифарево. Финансирането е осигурено по ПУДОС.</p>	

Мярка от ОПР	Отчетени проекти и инициативи	Неосъществени проекти и инициативи към края на 2016 г.
(сметница, нефункциониращи находища за инертни материали);		
Мярка 4.3. Въвеждане на система за управление на отпадъците, която е в съответствие със съвременните екологични изисквания и локрива територията на цялата община;		Проекти, произлизащи от ИПГВР на град Велико Търново
Мярка 4.4. Внедряване на мерки за повишаване качеството на атмосферния въздух и понижаване шумовото замърсяване;		Проекти, произлизащи от ИПГВР на град Велико Търново
Мярка 4.5. Оптимизиране на транспортната система в общината при осигуряване на достъпен обществен транспорт и условия за разнообразни форми на придвижване (автомобилно, пешеходно, велосипедно);	Неразделна част от утвърдената през 2016 г. Инвестиционна програма за реализация на ИПГВР Велико Търново е проект „Интегриран градски транспорт“. Неговият индикативен бюджет е 10 805 767,50 лв., които ще бъдат осигурени от ПО1 на ОПРР.	
Мярка 4.5. Повишаване на енергийната ефективност на административни, производствени и многофамилни жилищни сгради;	Обновяването и внедряването на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в община Велико Търново се финансира по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. До момента за завършени дейностите по 3 сгради с общ бюджет от 1 782 000 лв. Същевременно са стартирали строително-монтажните работи по още 5 сгради, а за 9 са изготвени енергийни обследвания.	Проекти, произлизащи от ИПГВР на град Велико Търново, свързани с обновяване на административни, производствени и многофамилни жилищни сгради.
Мярка 4.7. Производство на електроенергия от възобновяеми		Не са били налице условия за реализация на дейности по мярката;

Мярка от ОПР	Отчетени проекти и инициативи	Неосъществени проекти и инициативи към края на 2016 г.
енергийни източници;		
Мярка 4.8. Осигуряване на предпоставки и реклама за стимулиране на хранително-вкусовата промишленост в общината;	Община Велико Търново е кандидатствала с проектно предложение „FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти“ по Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“	Част от проект Проекти, произлизащи от ИПГВР на град Велико Търново
Мярка 4.9. Осигуряване на предпоставки и подкрепа за доразвитие на традиционните и конкурентоспособни преработващи промишлености;	Мярката е подкрепена индиректно от два проекта по ОПИК, чиято цел е подобряване на ресурсната ефективност в предприятията от преработващата промишленост в община Велико Търново.	Не са били налице условия учредяване на годишна награда на Община Велико Търново за принос развитието на местната икономика по категории: инвестиция, малък бизнес, социална отговорност, зелени политики и др.
Мярка 4.10. Увеличаване гъстотата на икономическите субекти в индустриалните зони и създаване на нови малки и средни предприятия;		Не са били налице условия за кандидатстване на В.Търново за домакинство на Български икономически форум.
Мярка 4.11. Изготвяне и реализиране на маркетингова стратегия за привличане на инвестиции и нови икономически инициативи в община Велико Търново;	Община Велико Търново е кандидатствала с проектно предложение „По-добра интеграция на трансграничния регион чрез заетост и привлекателна среда за инвестиции“ по Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“	Не са били налице условия за кандидатстване на В.Търново за домакинство на Български икономически форум.
Мярка 4.12. Оптимално използване на инвестиционния потенциал на общинската собственост;	Община Велико Търново използва своите организационни ресурси и капацитет за различни инициативи в изпълнение на годишни програми за управление и разпореждане с общинска собственост и придобиване на ново общинско имущество.	

Марка от ОЛР	Отчетени проекти и инициативи	Неосъществени проекти и инициативи към края на 2016 г.
<p>Марка 4.13. Регламентиране и контролиране олазването на целостта и устойчивото оползотворяване на горските територии.</p>	<p>През 2014 и 2015 г. със собствени средства е изработен горскостопански план на горите, собственост на Община Велико Търново.</p>	
<p>5. Наследство и туризъм</p>		
<p>Марка 5.1. Регламентиране на подход за интегрирано управление и развитие на културното наследство, креативните и туристическите индустрии, вкл. чрез координирана подготовка и прилагане на необходимите Документи;</p>	<p>На направените предложения съответства практиката за партньорство между Община Велико Търново и различни културни институции и оператори. Активните партньорства са насочени към координирана подготовка и провеждане на различни мероприятия, свързани с изкуството и нематериалното културно наследство.</p> <p>С принос към интегрираното управление и развитие на културното наследство е проект „Дигитална културна съкровищница "Север +" за дигитализиране на архива на КН в общината.</p>	
<p>Марка 5.2. Адекватно и законосъобразно управление и поддържане на защитените територии и зони;</p>	<p>Управлението на защитените територии и зони е в пряка зависимост от общинската политика по устройство на територията с нейния основен инструмент Общия устройствен план. ОУП определя ограничителните режими и изисквания по отношение на защитените територии и зони.</p>	
<p>Марка 5.3. Регламентиране на достъпимите дейности и преустановяване заузването на отпадъчни промишлени води по поречието на река Янтра;</p>	<p>Община Велико Търново е кандидатствала с проектно предложение „Модел за съвместно управление на риска за градове в трансграничния регион Румъния – България“ в партньорство с представител на регион Долж по Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ Делът на Община Велико Търново надхвърля 5 млн.</p>	

Мярка от ОПР	Отчетени проекти и инициативи	Неосъществени проекти и инициативи към края на 2016 г.
	<p>лв., като един от фокусите на проекта е устойчивото развитие на крайбрежието на река Янтра като неразделна част от природните и туристическите ресурси на града.</p>	
<p>Мярка 5.4. Гарантиране съответствието на консервационно-реставрационните дейности с принципите за запазването на автентичността на наследството (Венецианска харта);</p>	<p>Основен инструмент за управление на КН е създаденият обществен съвет за защита на културното наследство.</p>	
<p>Мярка 5.5. Осигуряване на подходи и средства за съхраняване единството и автентичността на историческите резервати, комплекси и ансамбли (групови културни ценности);</p>	<p>Организационният подход в съответствие с мярката е създаденият съвет за защита на културното наследство.</p> <p>Освен това, Община Велико Търново използва различни средства за физическото опазване на наследството. Откроява се стартираният през 2015 г. проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие“. Негов компонент е консервацията на Шишмановата баня, което е заложено в Програмата за реализация на ОПР.</p> <p>Със средства на общината са подкрепени фасадната реставрация, ремонтно –възстановителните работи и цветово решение за сгради от архитектурните ансамбли по ул. „Стефан Стамболов“ и ул. „Велчо Джамджията“.</p>	
<p>Мярка 5.6. Разработване на програма и осигуряване на средства за реновиране и социализация на археологически и архитектурни културни ценности в градовете и</p>	<p>Отчетените проекти по Мярка 5.5 допълват и създават синергия с изпълнението в рамките на тази мярка. По нея са инициирани консервационно-реставрационни дейности по обекти на АМР „Царевец“ и АМР „Трапезица“, Шишманова баня, както и за църкви в селата.</p>	<p>Допълнително проучване, консервация, реставрация и социализация на археологическия резерват Никополска ад Иструм; Обновяване на архитектурни културни</p>

Мярка от ОПР	Отчетени проекти и инициативи	Неосъществени проекти и инициативи към края на 2016 г.
селата;		<p>ценности в градовете Дебелец, Килифарево и селата Ресен, Самоводене, Леденик, Вонеща вода, Беляковец, Буковец, Дичин, Балван, Войнежа, Пушево, Велчево, Габровци, Миндъ, Ново село, Емен, Вългевци, Ялово и Присово;</p> <p>Частично неизпълнение на проект от ИПГВР – Експониране и адаптация на културно наследство (Архитектурно-музеен резерват "Царевец", Църквата "Св. св. Константин и Елена", "Църквата "Св. Спас", Паметник на обесените);</p>
<p>Мярка 5.7. Осигуряване на по-добри условия за разнообразен културен живот на населението и повече складови и експозиционни площи за културните институции предимствено чрез реновиране на исторически сгради;</p>	<p>Разнообразието в културния живот се подкрепя от ежегодния подбор и финансиране на проекти по общинската програма „Изкуство и култура“. През отчетния период са подкрепени 22 проекта. Общината е утвърдено място за провеждане на национални и международни фестивали, а ДКС „Васил Левски“ се използва за множество събития.</p> <p>Капиталовите разходи в наблюдавания период са насочени към ремонт на изложбените зали „Рафаел Михайлов“. През отчетния период е извършена подробна инвентаризация на състоянието на общинските културни институции.</p>	<p>Възстановяване на единствения в България музей на архитектурата във Велико Търново;</p> <p>Създаване на музей на фармацията в сградата на първата българска аптека;</p> <p>Изграждане на аудиториум "Никополис ад Иструм" в кв. 48 (терен на старата баня) в с. Ниюп. Представяне и популяризиране историята на археологическия резерват Никополис ад Иструм;</p> <p>Проекти/части от проекти, произлизащи от ИПГВР на град Велико Търново.</p>
Мярка 5.8. Формиране, обозначаване	<p>Реализациите включват основен ремонт на експотека с. Хотница,</p>	<p>Проекти/части от проекти, произлизащи от</p>

Мярка от ОПР	Отчетени проекти и инициативи	Неосъществени проекти и инициативи към края на 2016 г.
и популяризиране на мрежа от общински туристически маршрути на основата на съществуващите културни и еко маршрути;	както и текущи инициативи за доразвитие на местните и регионални туристически продукти, включително установените маршрути.	ИПГВР на град Велико Търново.
Мярка 5.9. Активно използване на открити публични пространства (улици, площади, градини, дворове на исторически стради) за културни събития и дейности;	През отчетния период са проведени културни събития и дейности в открити публични пространства - парк "Марно поле", парк "Майка България", парк „Асеновци“, крепостта Царевец, летния театър и в ателиетата на Самоводската чаршия, двора на църквата-музей „Св. Димитър Солунски“.	
Мярка 5.10. Провеждане на маркетингова стратегия спрямо националното и националното ниво, която представя пълното многообразие на историческото и природно наследство в общината (вкл. формираната мрежа от туристически маршрути);	През 2014 и 2015 година е предприето оптимизиране работата на общинското предприятие „Царевград Търнов“ ЕООД. Дружеството представлява специфичен местен модел за представяне на туристическите възможности и за увеличаване на предоставяните туристическите услуги в общината.	
Мярка 5.11. Разполагане на средства за туристическа информация и ориентация, следващи туристическите маршрути;	В град Велико Търново се поддържат в качествено състояние 30 указателни табели, ориентирани към културното наследство. Предстоящата реализация на одобреното проектно предложение „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по ПО1 на ОПРР ще има съществена полза към Мярка 5.11, както и към предходната Мярка 5.10. Компоненти на проектното предложение са обекти „Градска среда в старата градска част – Реконструкция, рехабилитация на уличната мрежа, прилежащи тротоари, пешеходни алеи, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, поставяне на указателни и	

Марка от ОПР	Отчетени проекти и инициативи	Неосъществени проекти и инициативи към края на 2016 г.
	<p>информационни табели, елементи на градското обзавеждане“, „Площад Съединение – въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, проектиране на дъждовна канализация, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на градското обзавеждане“ и „Реконструкция и рехабилитация на изгледните площи на ул. Стефан Стамболов“. Заложените инвестиции ще подобрят архитектурната среда по протежението на исторически направления в град Велико Търново, с което ще обогатят потенциалите на градските културно-туристически маршрути.</p>	
<p>Марка 5.12. Подобряване на туристическите услуги;</p>	<p>Община Велико Търново продължава инвестициите свързани с емблематични местни туристически продукции като функциониращия Мултимедия център „Царевград Търнов“, АМР „Трапезица“ и създадения през 2016 г. Център за интерпретация на културното наследство, както и провежданите аудио-визуални спектакли.</p>	
<p>б. Управление, партньорства и връзки</p>		
<p>Марка 6.1. Усъвършенстване на съществуващото електронно управление чрез разностранно предоставяне на услуги и обхващане на селата;</p>	<p>Община Велико Търново запазва водещата си позиция в развитието на електронното управление с въвеждането на нови модули и функционалности към платформата e-Община.</p>	
<p>Марка 6.2. Разработване и прилагане на комплексна ГИС платформа, като неразделна част от електронното управление на общината;</p>		<p>Не са били налице условия за реализация на дейности по мярката;</p>

Мярка от ОПР	Отчетени проекти и инициативи	Неосъществени проекти и инициативи към края на 2016 г.
<p>Мярка 6.3. Формиране на партньорски модел за съвместно взимане на решения и провеждане на конкретни инвестиции за обновяване на публичните пространства и многофамилните жилищни структури в градовете;</p>	<p>Разработената през 2016 г. Инвестиционна програма по ПО1 на ОПРР представлява подход за приоритизиране и избор на проекти от ИПГВР. От разнородните проекти за финансиране по ПО1 с обща стойност 125 819 000 лв. е подбран набор с размер от 44 688 641,93 лв., от които 43 382 874,43 лв. са БФП по ПО1. Работата по програмата се основава на поредица заседания на работна група с представителство на различни заинтересовани страни и партньори на администрацията, утвърдили начина за разпределение на над 44 млн лв.</p>	
<p>Мярка 6.4. Стимулиране активен и открит диалог между местната власт, неправителствения сектор и бизнеса за постигане на ефективен баланс между публичния и частния интерес;</p>	<p>Официалният интернет портал на община Велико Търново осигурява базовите предпоставки за взаимодействие между трите сектора. Структурата, функционалността и разнообразното съдържание на портала предоставят информация за различни проблеми, необходими инициативи и инвестиции, свързани с развитието на градската среда и икономиката.</p> <p>Посочената Инвестиционна програма е пример за успешен диалог между различни страни. В резултат на проведените срещи е взето съвместно решение за разпределение на разходи между обществени и икономически зони в град Велико Търново.</p>	
<p>Мярка 6.5. Активизиране на междуобщинското сътрудничество между Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец за повече инициативи и инвестиции в сферата на транспорта, логистиката и конкурентните производства;</p>		<p>Не са били налице условия за реализация на дейности по мярката;</p>

Мярка от ОПР	Отчетени проекти и инициативи	Неосъществени проекти и инициативи към края на 2016 г.
<p>Мярка б.б. Създаване на партньорска мрежа между образователните институции, бизнеса и община Велико Търново за съвместно планиране на учебните програми и прилагане на метода „учене чрез работа“;</p>		<p>Не са били налице условия за реализация на дейности по мярката;</p>
<p>Мярка б.7. Стимулиране на сътрудничество между културните институции, креативната индустрия, частните собственици и туристическия бранш, координирани от Общинската администрация във Велико Търново;</p>	<p>Важна предпоставка за подобно сътрудничество е създаденият през 2016 г. общественно-експертен съвет по култура.</p>	
<p>Мярка б.8. Подкрепа за създаване и изграждане капацитет на икономически кълъстери на базата на широки партньорства между местната власт, университетите, бизнеса и неправителствения сектор;</p>		<p>Не са били налице условия за реализация на дейности по мярката;</p>
<p>Мярка б.9. Доразвиване и обогатяване на вече съществуващия междубаншски туристически продукт до общ регионален продукт.</p>	<p>В рамките на отчетния период са създадени 5 тематични и надобщински туристически продукта, чиито акцент са забележителностите и туристическата инфраструктура в община Велико Търново. Част от изпълнението на мярката е успешно популяризиране и приложението на резултати от проекти, предхождани разработването на ОПР.</p>	

3. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОПР

3.1. Анализ и оценка на проектите от гледна точка целите и приоритетите в ОПР

В предходния раздел бяха разкрити типовете изпълнени проекти и инициативи като обща картина на резултатите от изпълнението на ОПР. В Таблица 4 е представен количествен анализ, при който единичните финансови параметри на остойностените проекти и инициативи са обобщени в общо финансово изпълнение. Получените стойности и тяхното съпоставяне с индикативната финансова таблица от общинския план позволява да се направи количествена оценка за степента на изпълнение на приоритетните области – процентът финансово изпълнение се използва като индикатор за степента на постигане на приоритетите. Разработването на Общинския план за развитие се базира на „интегрирания подход“ в стратегическото планиране. В резултат, отделните приоритетни области са с дефиниции и обхват, така че да допринасят заедно за постигането на стратегическите цели. Всяка приоритетна област има определен принос към четирите цели от ОПР и по този начин проследените резултати за приоритетните области отразяват степента на постигане на целите на ОПР. Методиката на работа включва:

- (1) разпределение на бюджета на даден проект според наличната информация за дяловете на различните финансови източници;
- (2) сумиране на общите стойности за всички изпълнени проекти;
- (3) разпределение на общата сума по приоритетни области и източници;
- (4) разпределение на сумата по четирите категории проекти и инициативи (съгласно дефиницията от т. 4).

Общата финансова равностметка за всички реализации, включително и четирите дефинирани категории, възлиза на 91 067 900 лв. Отнесена към индикативната финансова цел на ОПР за 2016 от 275 200 480, степента на общо изпълнение достига 33,09%. Аналогичната стойност, но за 2020 година е 17,01%. Показанията за отделните приоритетни области показват значителни разлики в техните приноси към общото изпълнение. Двете приоритетни области „Градове и фокуси на растеж“ и „Равни възможности“ формират 61 861 400 лв., равни на 68% от общия резултат. Областите „Ресурси и продукция“ и „Наследство и туризъм“ са с финансово измерение от съответно 9 691 000 лв. и 13 061 000 лв. Реализираните проекти за развитие на селата, въпреки големия си брой, се равняват на 6 095 500 лв. или 6,69% от сумата за всички отчетени проекти. Последната приоритетна област, „Управление, партньорства и връзки“, на практика няма остойностен принос със своите 359 000 лв.

Комбинирането на финансовите резултати и отчетите на проектите като брой и като разпределение по мерки (т. 2) разкрива няколко зависимости:

- (1) Съществува пряка връзка между големият брой проекти/мерки с изпълнение и общата стойност на приоритетни области „Градове и фокуси на растеж“ и „Равни възможности“;
- (2) Въпреки големият брой начинания по мерките от приоритетна област „Наследство и туризъм“, приоритетът остава с по-малка стойност заради наличните инициативи без точен бюджет;

(3) Малкият брой проекти в област „Ресурси и продукция“ формира значителен общ бюджет и много висока средна стойност на проект;


(4) Въпреки мобилизираните усилия за насърчаване на развитието на селата, редица мерки остават без съдържание от проекти, докато реализираните такива са с много ниски стойности.

Таблица 4. Степен на изпълнение на ОПР

Приоритетна област	Реализирани/ стартирани проекти със съответствие		Реализирани/ стартирани проекти с принос		Оценени проекти предложения	Проектни предложения в оценка	Общо	Цел за 2016	Степен на изпълнение спрямо 2016	Цел за 2020	Степен на изпълнение спрямо 2020
	Хил. лв.	Хил. лв.	Хил. лв.	Хил. лв.							
Градове и фокуси на растеж	12 975,00	11 834,00	13 010,00	-	37 819,00	56 531,08	66,90	109 300,00	34,60		
Села и периферни територии	119,00	5 982,50	-	-	6 095,50	26 019,09	23,43	40 363,00	15,10		
Равни възможности	7 613,00	2 886,40	10 911,00	2 632,00	24 042,40	38 884,43	61,83	97 152,00	24,75		
Ресурси и продукция	1 568,00	2 456,00	-	5 667,00	9 691,00	118 159,19	8,20	229 377,00	4,22		
Наследство и туризъм	1 907,00	1 176,00	-	9 978,00	13 061,00	21 226,47	61,53	37 239,00	35,07		
Управление, партньорства и връзки	44,00	315,00	-	-	359,00	14 380,22	2,50	21 798,00	1,65		
Общо	24 220,00	24 649,90	23 921,00	18 277,00	91 067,90	275 200,48	33,09	535 229,00	17,01		


От Таблицата е видно, че ПО „Градове и фокуси на растеж“ достига най-висока степен на изпълнение към края на 2016 г. – 66,90%. Следват „Равни възможности“ с 61,83% и „Наследство и туризъм“ с 61,53%. Останалите три области остават с много ниска степен на изпълнение, като предвиденията по отношение на селата са постигнати на 23,43%, на „Ресурси и продукция“ – 8,20%, на управлението – 2,50%.

Фигура 4. Изпълнение спрямо финансовите цели за 2016 и 2020 г.

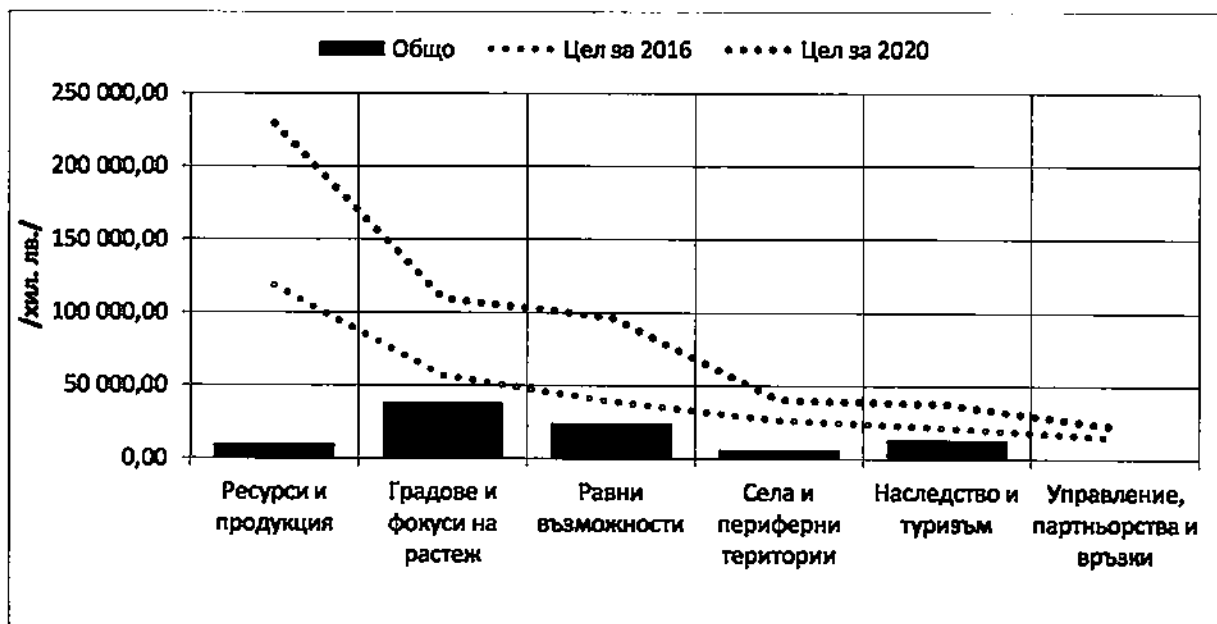

Фиг. 4 нагледно представя трите доближаващи се до своите цели приоритетни области. Вижда се, че областите „Градове и фокуси на растеж“, „Равни възможности“ и „Наследство и туризъм“ постигат висок процент реализация заради постигнатото съотношение между планирана и постигната стойност. Направление „Ресурси и продукция“, въпреки че по обем привлечени средства е съизмерима с „Наследство и туризъм“, остава далеч от своята цел – 118 159 190 лв. към края на 2016 г. Много високата планирана стойност на проектите в тази област предопределят и очакванията за ниска степен на изпълнение и към 2020 г., като към момента са постигнати само 4,22%.

Фигура 5. Изпълнение по приоритетни области и категории проекти/инициативи

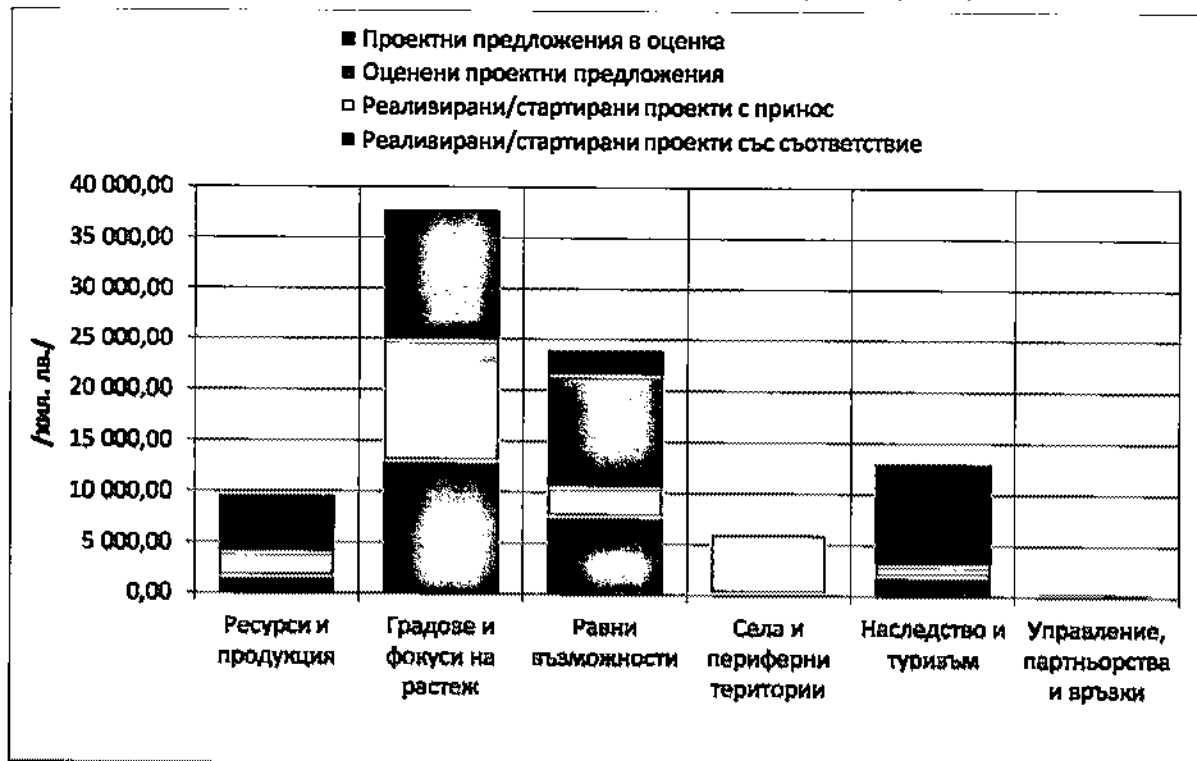

Разпределението на сумата по четирите категории проекти и инициативи (съгласно дефиницията от т. 2.1) показва няколко закономерности. Високите степени на изпълнение по отношение на приоритети „Градове и фокуси на растеж“, „Равни възможности“ са следствие на договорените проекти и суми по ПО1 на ОПРР. При област „Наследство и туризъм“ се разкрива зависимост на добрия резултат от проектите в процес на оценка, която поставя под въпросителна положението след оценката на подадените проектни предложения. Същата зависимост е налице и при „Ресурси и продукция“, където резултатът при неодобрение ще спадне до 4% изпълнение. Илюстрацията показва, че област „Села и периферни територии“ се характеризира преобладаващо от проекти с принос към мерките на ОПР, и малък брой проекти, които са били заложили в Програмата за реализация на плана. Приоритетна област „Равни възможности“ се наблюдава много голяма приемственост между заложените конкретни проекти в плана и последващите реализации.

Досега направените анализи и изведени оценки извеждат въпроса за по-ниската степен на изпълнение на приоритетите на ОПР, а тя произлиза от интерпретацията на планирания бюджет на ОПР, неразделна част от който е ИПГВР на град Велико Търново. Неговият дял достига 333 264 000, равняващи се на 62% от бюджета на ОПР.

По-детайлното разглеждане на проектите от ИПГВР показва, че очакваното финансиране по ПО1 на ОПРР към момента на разработването му е 125 819 000 лв. Реално постижимото финансиране през следващите години обаче е ограничено до 44 688 641,93 лв, (43 382 874,43 лв. БФП и 1 305 767,50 собствен принос), заложили в Инвестиционната програма за реализация на ИПГВР по ПО1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 (както и евентуално увеличение при изпълнение на резервни проекти). Същевременно ИПГВР на град Велико Търново включва значителен обем проекти по ОПИК, които към днешна дата не са избираеми заради несъответствие между проектните идеи и допустимите дейности на програмата за периода 2014-2020 и същевременно са зависими от частни инвестиции интерес. Тези проекти са с бюджет от над 80 000 000 лв. Могат да се формулират следните причини за постигната степен на изпълнение на приоритетите на ОПРР:

- (1) значително несъответствие между планираните и постижимите проекти и инвестиции в ИПГВР Велико Търново по отношение на ПО1 на ОПРР 2014-2020 и ОПИК 2014-2020;
- (2) високи финансови параметри на проекти от ИПГВР, предвидени за финансиране по ОПИК, ОПОС и ОПНОИР за настоящия планов период, които към момента не са реално постижими;
- (3) забавяне в процедурите на ОПОС 2014-2020, свързани с обновяването и изграждането на водоснабдителни и канализационни системи, което заема важно място както в проектите на ИПГВР, така и в останалите проекти на общинския план;
- (4) забавяне в процедурите на ОПНОИР 2014-2020, свързани с реализирането на проекти в подкрепа на „икономика на знанието“;
- (5) „Села и периферни територии“ остава с нисък процент, както заради големия брой идентифицирани проблеми и проекти, така и заради ограничените възможности за външно на общинския бюджет финансиране на подобни проекти в община Велико Търново;
- (6) „Наследство и туризъм“ до момента остава без част от проектите за консервация и реставрация на археологически и културни ценности заради забавеното утвърждаване на

„Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ във връзка с финансирането по ПО „Регионален туризъм“ на ОПРР 2014-2020;

(7) „Ресурси и продукция“ остава с нисък процент заради планираните мащабни инвестиции по проекти за енергийна ефективност и ВиК, които към момента не са обезпечени с реалистичен финансов източник, поради изброените по-горе причини.

Изброените причини са мотив за извеждане на „алтернативна“ таблица за изпълнението на ОПР, при която целевите стойности са коригирани, така че планираното и реално постижимото изпълнение да бъдат доближени. От целевите стойности за отделните приоритети са извадени средства по ПО1 на ОПРР, надхвърлящи Инвестиционната програма, стойностите на проекти от ИПГВР по ОПИК 2014-2020 (вкл. нужните частни дялове) и планираната БФП по ОПОС към края на 2016 г. При тази алтернативна оценка, степента на изпълнение достига 57,80%, а за ПО „Градове и фокуси на растеж“ се наблюдава преизпълнение. Ниските показания се запазват за ПО „Села и периферни територии“ и „Управление, партньорства и връзки“.

Таблица 5. Алтернативна таблица за степента на изпълнение на ОПР

Приоритетна област	Общо за четирите категории по т. 2.1	Коригирана цел за 2016	Степен на изпълнение спрямо 2016
	хил. лв	хил. лв	%
Градове и фокуси на растеж	37 819,00	36 015,66	105,01
Села и периферни територии	6 095,50	26 019,09	23,43
Равни възможности	24 042,40	38 884,43	61,83
Ресурси и продукция	9 691,00	24 559,90	39,46
Наследство и туризъм	13 061,00	17 695,47	73,81
Управление, партньорства и връзки	359,00	14 380,22	2,50
Общо	91 067,90	157 554,78	57,80

3.2. ОТЧИТАНЕ АКТУАЛНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ИНДИКАТОРИТЕ ОТ ОПР

След оценката за степента на финансирано изпълнение на проектите, следва отчитане на актуалните стойности на индикаторите за измерване на целите и приоритетите от ОПР. Сравнението между реалните и целевите стойности позволява втори подход за преценка на степента в реализацията на ОПР. Разгледани са индикаторите с **достоверен източник на информация към момента на изготвяне на оценката**. Постигнатите стойности показват висока степен на изпълнение за целите и приоритетите на плана. Въпреки, че наличните към момента статистически данни от ТСБ-Велико Търново са за 2015 г., значителна част от заложените икономически и социални индикатори са преизпълнени. Информационното осигуряване на останалите индикатори е свързано с дейността на ресорите в общинска администрация, които са предоставили данни за 2016 г. Част от индикаторите се проследяват с натрупване – например брой реализирани проекти в рамките на отчетния период.

Таблица 6. Индикатори в действие

Индикатор за действие	Мерна единица	Източник на информация	Базова стойност (година на отчитане)	Междинна стойност (2016 г.)	Отчетена стойност (година на отчитане)	Степен на изпълнение
Стратегическа цел 1: Висока международна популярност на съхранено и извезено многообразие на природното и културното наследство						
Реализирани нощувки от чужденци	Брой	ТСБ – Велико Търново	57 202 (2012 г.)	66 000	57 583 (2015 г.)	87%
Дял на реализираните нощувки от чужденци от общия брой реализирани нощувки в общината (%)	Процент	ТСБ – Велико Търново	28 (2012 г.)	30	27,7 (2015 г.)	92%
Дял на приходите от туризъм и култура спрямо общите приходи на нефинансовите предприятия в общината	Процент	ТСБ – Велико Търново	2,66 (2011)	3,2	2,9 (2015 г.)	91%
Общ брой туристически забележителности, включени в туристически маршрути	Брой	Община Велико Търново	X	>10	59 (2016 г.)	Преизпълнение

Индикатор за въздействието	Мерна единица	Източник на информация	Базова стойност (година на отчитане)	Междинна стойност (2016 г.)	Отчетена стойност (година на отчитане)	Степен на изпълнение
Брой реализирани проекти, свързани с опазването на културното наследство и развитието на културен туризъм	Брой	Община Велико Търново	X	>5	44 (2014-16 г.)	Преизпълнение
Стратегическа цел 2: Икономически растеж, основан на допълващи се дейности и продукти, местно предприемачество, външни инвестиции и активна връзка между образование и бизнес						
Дял от произведената продукция от общата продукция за областта	Процент	ТСБ – Велико Търново	42,3	43	40,9 (2015 г.)	95%
Брой предприятия в общината	Брой	ТСБ – Велико Търново	4 796 (2011 г.)	5 000	5 041 (2015 г.)	101%
Брой нефинансови предприятия на 1 000 души от населението	Брой	ТСБ – Велико Търново	54 (2011 г.)	57	57,7 (2015 г.)	101%
Стратегическа цел 3: Подобрена жизнена среда в градовете и селата, обезпечени с качествени публични услуги и добро управление						
Изпълнение на бюджета предвиден в ИПГВР	Процент	Община Велико Търново, ИСУН	0	20	10,6 (2016 г.)	53%
Обем на привлечените средства по ОПРР и СПОС	Млн. лв.	Община Велико Търново, ИСУН	0	>15	23,9 (2014-16 г.)	Преизпълнение
Извършени (дребни) престъпления	Брой	ОД на МВР	X	X	69 (2016 г.)	-
Естествен прираст на 1 000 души от населението	Промила	ТСБ – Велико Търново	-3,9 (2012 г.)	-3,6	-4,2 (2015 г.)	Влошаване
Стратегическа цел 4: Засилена роля на регионален център и фокус на междубюджетни инициативи и						

Индикатор за въздействие	Мерна единица	Източник на информация	Базова стойност (година на отчитане)	Междинна стойност (2016 г.)	Отчетена стойност (година на отчитане)	Степен на изпълнение
продукти						
Брой разработени междуобщински програми, проекти, стратегии, проекти и др.	Брой	Община Велико Търново	X	>2	7 (2014-16 г.)	Преизпълнение
Относителен дял на приходите от дейността на предприятията в общината спрямо общите за област Велико Търново	Процент	ТСБ – Велико Търново	45,6 (2011 г.)	47	43,6 (2015 г.)	93%
Създадени регионални туристически продукти	Брой	Община Велико Търново	X	>1	5 (2014-16 г.)	Преизпълнение

Таблица 7. Индикатори за резултат

Индикатор за резултат	Мерна единица	Източник на информация	Базова стойност (година на отчитане)	Междинна стойност (2017 г.)	Отчетена стойност (година на отчитане)	Степен на изпълнение
Приоритетна област 1: Градове и фокуси на растеж						
Дължина на общинските пътища в добро състояние (вкл. отлично), според класификацията на общинската адм.	км	Община Велико Търново	30 (2013)	40	32 (2016 г.)	80%
Дял на произведената продукция в отрасъл транспорт и складови дейности, от общата за областта	Процент	ТСБ – Велико Търново	63,82 (2011 г.)	64,5	60,5 (2015 г.)	94%
Брой предприятия, управляващи икономическа дейност „транспорт, складиране и пощи“	Брой	ТСБ – Велико Търново	179 (2011 г.)	203	202 (2015 г.)	99,5%
Брой реконструирани (обновени) публични пространства	Брой	Община Велико Търново	0 (2013)	>7	12 (2014-16 г.)	Преизпълнение

Индикатор за резултат	Мерна единица	Източник на информация	Базова стойност (година на отчитане)	Междинна стойност (2017 г.)	Отчетена стойност (година на отчитане)	Степен на изпълнение
Реализирани инвестиции в съществуващите индустриални зони	Млн. лв.	Община Велико Търново	0	>1,5	12,7 (2014-16 г.)	Преизпълнение
Брой спортни площадки, отговарящи на европейските изисквания	Брой	Община Велико Търново	X	>30	8 (2016 г.)	Неизпълнение
Реализирани кампании за реклама на Велико Търново като място за инвестиции, образование и живеене	Брой	Община Велико Търново	0	6	5 (2014-16 г.)	83,3%
Произведена продукция от професионални дейности и научни изследвания	Хил. лв.	ТСБ – Велико Търново	15 738	16 000	20 908 (2015 г.)	131%
Приоритетна област 2: Села и периферни територии						
Приходи от дейност „селско, горско и рибно стопанство“	Хил. лв.	ТСБ – Велико Търново	108 546 (2011 г.)	115 000	136 750 (2015 г.)	119%
Брой реализирани проекти за рехабилитация и изграждане на техническа инфраструктура в селата	Брой	Община Велико Търново	0	>7	125 (2014-16 г.)	Преизпълнение
Брой обществени сгради в селата, с внедрени мерки за енергийна ефективност	Брой	Община Велико Търново	0	>15	13 (2014-16 г.)	Неизпълнение
Брой на обезлюдените села в общината	Брой	ТСБ – Велико Търново	22 (2013)	22	22 (2015 г.)	100%
Приоритетна област 3: Равни възможности						
Брой легла в болничните заведения на 10 000 души от населението	Брой	ТСБ – Велико Търново	108,26 (2011)	120	115 (2015 г.)	95,8%
Капацитет на домовете за социални грижи (специализирани институции)	Брой	Община Велико Търново	497 (2012)	473	277 (2016 г.)	Преизпълнение /подобляването на индикатора се изразява в намаляване на

Индикатор за резултат	Мерна единица	Източник на информация	Базова стойност (година на отчитане)	Междинна стойност (2017 г.)	Отчетена стойност (година на отчитане)	Степен на изпълнение
						стойностите му/
Капацитет на социалните обекти от резидентен тип	Брой	Община Велико Търново	138 (2013)	167	209 (2016 г.)	125%
Брой ученици, записани в професионални гимназии	Брой	Община Велико Търново	2075 (2012/13 г.)	2 100	1 502 (2016 г.)	71,9%
Брой лица, обхванати от проекти за интеграция на рискови социални групи на пазара на труда	Брой	Община Велико Търново	X	>30	375 (2014-16 г.)	Преизпълнение
Реализирани проекти за подобряване на социалните услуги	Брой	Община Велико Търново	43 (2013)	>60	94 (2014-16 г.)	Преизпълнение
Приоритетна област 4: Ресурси и продукция						
Брой на пунктовете за наблюдение на шума, измерили нива в диапазона 68-72 dB	Брой	Община Велико Търново	6 (2013)	5	3 (2016 г.)	Преизпълнение /подобряването на индикатора се изразява в намаляване на стойностите му/
Брой превозени пътници в обществен транспорт/годишно	Брой	Община Велико Търново/ транспортни оператори	3 430 000 (2013)	3 500 000	2 837 000 (2016 г.)	Влошаване
Гъстота на фирмите на 1 000 човека	Брой/1 000	ТСБ – Велико Търново	54,2 (2011)	55	57,7 (2015 г.)	105%
Брой публични сгради с внедрени мерки за енергийна ефективност	Брой	Община Велико Търново	0 (2013)	>20	30 (2014-16 г.)	Преизпълнение
Приоритетна област 5: Наследство и туризъм						
Брой указателни табели в градската среда, ориентирани към културното	Брой	Община Велико Търново	X	>45	30 (2016 г.)	Неизпълнение

Индикатор за резултат	Мерна единица	Източник на информация	Базова стойност (година на отчитане)	Междинна стойност (2017 г.)	Отчетена стойност (година на отчитане)	Степен на изпълнение
наследство						
Брой на установените културно-опознавателни маршрути	Брой	Община Велико Търново	X	>3	15 (2016 г.)	Преизпълнение
Средногодишно проведени културни събития	Брой	Община Велико Търново	X	>100	496 (2016 г.)	Преизпълнение
Приход от реализирани нощувки на едно легло годишно	Лв./легло/год.	ТСБ – Велико Търново	2 697 (2012)	3 000	3 040 (2015 г.)	101%
Реализирани нощувки годишно	Брой	ТСБ – Велико Търново	203 856 (2012)	220 000	207 779 (2015 г.)	94,4%
Приоритетна област 6: Управление, партньорства и връзки						
Брой реализирани проекти, съвместно с общините Горна Оряховица и Лясковец	Брой	Община Велико Търново	0 (2013)	>1	0 (2014-16 г.)	Неизпълнение
Брой стажанти, преминали стаж в общинската администрация	Брой	Община Велико Търново	8 (2013)	>40	50 (2016 г.)	Преизпълнение
Общински служители преминали, курсове за повишаване на квалификацията	Брой	Община Велико Търново	X	>10	26 (2016 г.)	Преизпълнение
Проекти, реализирани съвместно с НПО	Брой	Община Велико Търново	0	>4	4 (2014-16 г.)	Изпълнение

4. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ

Настоящата оценка ще провери два аспекта:

- (1) доколко използваните ресурси са довели до очакваните резултати (цели, приоритетни области и завършени проекти от Програмата за реализация) – ефективност;
- (2) доколко начинът за изпълнение на ОПР се основава на добро управление на ресурсите – ефикасност.

Оценката на ефективността беше определена в т. 2 и т. 3 с разглеждането на следните фактори:


- (1) изпълнени проекти/инициативи по мерки;
- (2) неизпълнени проекти/инициативи;
- (3) степен на изпълнение на приоритетните области според финансовото им отчитане;
- (4) степен на изпълнение на целите и приоритетите според индикаторите на ОПР.

На този етап се предлага обобщение на ефективността общо за плана, както и по отделните приоритетни области.

Ефикасността ще бъде разгледана от гледна точка начина за използване на достъпните финансови и наличните организационни ресурси в Община Велико Търново.

4.1. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА

Фигура 6. Ефективност на изпълнение по приоритетни области

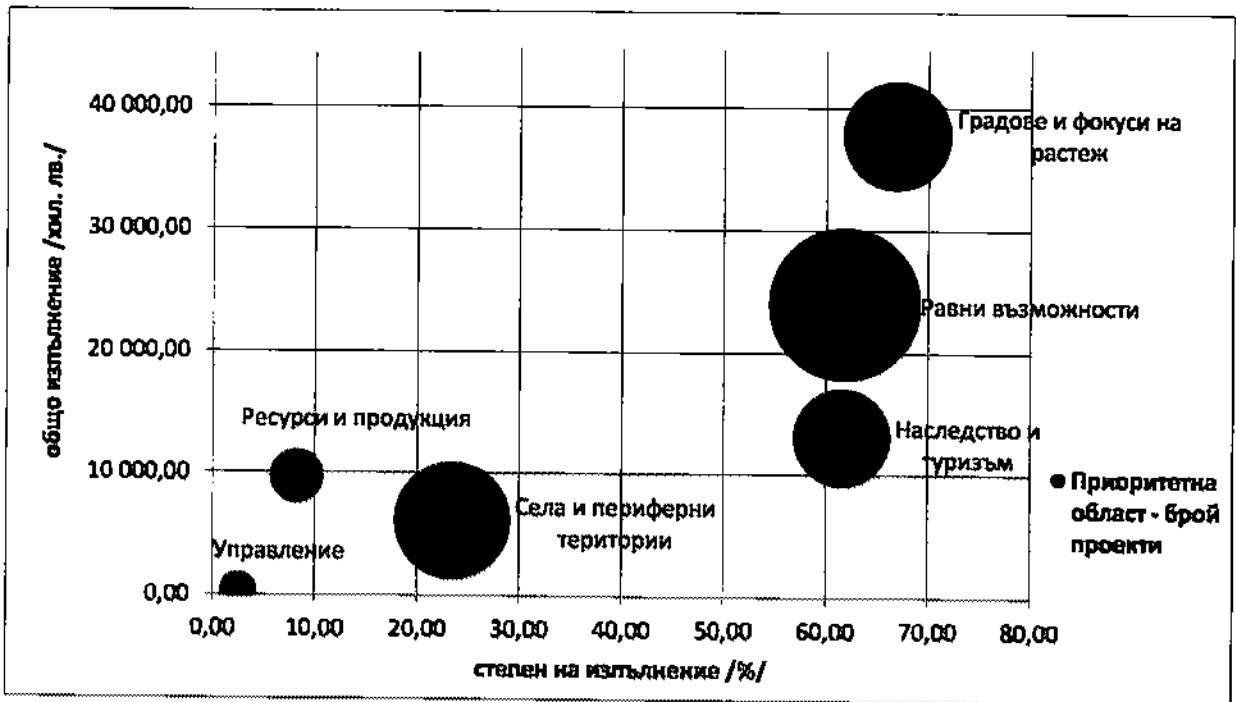

Фиг. 6 в значителна степен обобщава резултатите на т. 2 и т. 3. Наблюдава се дисбаланс между изпълнението на отделните приоритетни области. Големината на кръга разкрива броя проекти, разположението в лявата част – висока степен на изпълнение, а в горната част – висок обем на отчетените финансови ресурси. По този начин могат да се открият две ясни групи приоритетни области – с висока и ограничена ефективност.

Отчитането на актуалните стойности на заложените индикатори (т. 3.2) показва обща висока степен на изпълнение на плана. Наборът от индикатори за въздействие и резултат разкриват постигнатото социално-икономическо състояние към края на 2016 г. и обобщават вложените усилия за неговото подобряване. И двата типа индикатори показват преизпълнение или значително доближаване до целевите стойности и изолирани случаи на влошени показатели, които не са основание за негативна оценка на определен сектор. Напротив, отчетените стойности разкриват положителни тенденции в различните направления на развитие.

По отношение на индикаторите за въздействие, отразяващи целите на ОПР, единствено Стратегическа цел 3: „Подобрена жизнена среда в градовете и селата, обезпечени с качествени публични услуги и добро управление“ остава с по-ниски показатели, което е свързано с генералния дефицит на публични средства за подобряване на техническите инфраструктури в българските населени места. Индикаторите за останалите цели показват висока икономическа активност в утвърдените отрасли, акцент върху развитието на атрактивен туристически продукт и значителни усилия за водеща роля на Община Велико Търново в трансгранични проекти.

Индикаторите за резултат са израз на приоритетните области и техните мерки. Положителните резултати потвърждават усилията за последователно изпълнение на всички мерки от ОПР. Могат да се обобщят следните изводи по приоритетни области:

- (1) ПО „Градове и фокуси на растеж“ – добро развитие на транспорта и логистиката, заедно с научните дейности; успешна реализация на частни проекти в индустриалните зони, което ще създаде синергия с предвидените публични инвестиции в Западна индустриална зона по ПО1 на ОПРР 2014-2020; въпреки приоритетното изразходване на средства, състоянието на общинските пътища остава незадоволително;
- (2) ПО „Села и периферни територии“ – реализация на голям брой проекти и инициативи, които остават с ограничен обхват и ниски стойности; подобрене на икономическите показатели за сектор „селско стопанство“;
- (3) ПО „Равни възможности“ – много високи постигнати стойности, с изключение на броя на учащите в професионалните гимназии;
- (4) ПО „Ресурси и продукция“ – въпреки малкия брой проекти, индикаторите показват успешно изпълнение;
- (5) ПО „Наследство и туризъм“ – висока степен на изпълнение, с необходимост от подобряване на средствата за туристическа информация и ориентация;
- (6) ПО „Управление, партньорства и връзки“ – липса на междуобщински проекти в рамките на област Велико Търново.

4.2. Анализ и оценка на изразходваните финансови ресурси

Финансовият отчет за изпълнението на ОПР до момента достига 91 067 900 лв. Разпределението на стойността по източници на финансиране показва доброто комбиниране на различни форми на финансиране. През отчетния период, Община Велико

Търново и останалите участници в общинското развитие са привлекли, кандидатствали и осигурили средства от следните източници:

- (1) местно публично финансиране;
- (2) централен бюджет;
- (3) оперативни програми;
- (4) други международни източници на финансиране, включително трансгранични програми;
- (5) частно финансиране;
- (6) приватизация.

Изразходваните собствени средства на общината достигат 6 971 400 лв., от които 363 000 лв. са за съфинансиране на проекти с европейско финансиране. Съществен дял от останалите средства са използвани за капиталови разходи на общината, включително обновяване и ремонт на публични сгради, закупуване на оборудване и обзавеждане за различни образователни и социални обекти. Посочените разходи попадат в обхвата на приоритетни области „Градове и фокуси на растеж“, „Равни възможности“, „Села и периферни територии“, като мобилизирането на местни ресурси за развитието на селата се олицетворява и от успешната практика Фонд „Инициативи на местните общности“. Общинските финанси регулярно се използват за осъществяване на инициативи в подкрепа на историческото наследство и съвременния културен живот в общината, като разходите за приоритет „Наследство и туризъм“ са 2 121 000 лв. или над 30% от разпределението на този източник.

През последните три години, централният бюджет се утвърждава като много важен инструмент за изпълнение на програмата за капиталови разходи на общината, национално съфинансиране на проекти с европейско финансиране и др. Общият дял на държавните средства от изразходваните ресурси достига 24%. Тяхното разпределение показва, че за направление „Градове и фокуси на растеж“ са били отредени 12 912 000 лв. или 59%. Високата стойност е свързана с направените ремонти на техническа инфраструктура в град Велико Търново чрез осигурените целеви субсидии от централния бюджет.

Според Индикативната финансова таблица на ОПР, 32% от планирания бюджет са свързани с безвъзмездна финансова помощ от оперативни програми. Финансовата оценка към момента показва, че планираната роля на оперативните програми е изпълнена с 39% от отчетените 91 067 900 лв. Тяхното разпределение по приоритетни области не е равномерно, като се отличават „Градове и фокуси на растеж“ с 18 851 000 лв. и „Равните възможности“ с 14 511 000 лв., резултат най-вече от договорените средства за проектните предложения по ПО1 на ОПРР 2014-2020. Останалите приоритетни области остават с по-малко привлечени средства заради вече изброените обстоятелства, свързани с използването на ОПИК, ОПОС и ОПНОИР в периода 2014-2016 г.

В сравнение с финансовия план на ОПР, средствата от други международни финансови източници, включително трансгранични програми, заемат по-висок дял от финансовия отчет на проследените проекти и инициативи. Това е вследствие на активността на Община Велико Търново в подготовката на партньорства и проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, попадащи

към момента в четвъртата категория проекти/инициативи според т. 2.1. В допълнение се реализира мащабен проект по Националния доверителен екофонд за енергийна ефективност на общински училища.

Частното финансиране също има принос към изпълнението на общинския план. Проектите на частния сектор по ОПИК 2014-2020 и ОПРЧР 2014-2020 успешно потъпват мерките на ОПР за подобряване конкурентоспособността на местния бизнес и повече възможности за заетост.

Средствата на община Велико Търново, свързани с приватизация, са насочени основно за реконструкция на техническа инфраструктура в селата. С този модел се потвърждават опитите за осигуряване на инвестиции извън трите града на общината.

Фигура 7. Разпределение на финансовите ресурси по източници



Оценката на изразходваните финансови ресурси продължава с представяне на тяхната разбивка по приоритетните области и по финансови източници (Таблица 8). Изчислената степен на изпълнение спрямо заложеното в ОПР за 2016 г. разкрива „многоцветна“ картина за различните комбинации от приоритетна област и източник на финансиране. Това се дължи както на възникналите през годините актуални проблеми и потребности в рамките на отделните приоритетни области, така и на съответстващите им реални възможности за финансиране. Динамиката в двете посоки прави съответствието между план и отчет трудно постижимо. За това Междинната оценка разглежда основно общата равнотежка за разбивката по приоритетни области и по финансови източници. Тя потвърждава по-горните констатации по отношение подхода за търсене на алтернативно финансиране с кандидатстване по програми за трансгранично сътрудничество. Степента на (пре)изпълнение за източник „Други международни финансови източници“ надхвърля 201% общо.

Следващият най-добър резултат се наблюдава при средствата от централния бюджет, чиято степен на изпълнение/изразходване е 60,83%, докато при местното публично финансиране е 23,46%. Доколкото собствените средства на общината и различните форми на държавни субсидии съвместно формират инвестиционната програма за капиталови разходи, то двете категории разходи могат да се оценят в тяхното единство. Те формират общо 28 797 400 лв. или 31,62% от общия отчет. Относителният дял надхвърля заложените индикативен финансов план от ОПР (23,84%), което е положителен индикатор за по-малка зависимост на общинското развитие от оперативните програми. Същевременно, абсолютната стойност остава по-ниска спрямо заложеното, което посочва наличието на неизпълнени проекти от Програмата за реализация на ОПР. Тя съдържа значителен брой проекти, за които не е приложимо използването на външен източник на финансиране и е предвидено ползването на общински или държавни средства. Подобен е примерът с инфраструктурните проекти от приоритет „Села и периферни територии“, които не са допустими за финансиране по ПРСР 2014-2020.

Привлечените или договорените средства по оперативните програми показват изпълнение от 20,58%, което се дължи на нереалистичния към днешна дата мащаб на проекти от ИПГВР на град Велико Търново. Приносите на отделните приоритетни области за този процент се различават значително. Докато този вид финансиране на проекти от „Градове и фокуси на растеж“ е постигнат на 61,29%, а за „Равни възможности“ – 47,26%, процентите за „Ресурси и продукция“ и „Управление, партньорства и връзки“ са съответно 0,98% и 2,79%. Високите стойности в първите два случая са свързани с договорените средства по ПО1 на ОПРР, докато посоченият нисък процент за „Ресурси и продукция“ е в зависимост от бавното изпълнение на ОПОС 2014-2020. При приоритетна област „Наследство и туризъм“ не са привлечени средства по оперативните програми, по план свързани предимно с приоритетна ос „Регионален туризъм“ на ОПРР 2014-2020, която ще се изпълнява през следващите години.

Частните инвестиции в съответствие с ОПР са 4 015 000 лв. Степента на изпълнение е 15,29%, което отново е обвързано с проекти от ИПГВР – проекти по ОПИК 2014-2020 с висок дял частно съфинансиране.

Таблица В. Степен на изпълнение по приоритетни области и финансови източници

Приоритетна област	Местно публично финансиране	Цел за 2016	Степен на изпълнение спрямо 2016	Централен бюджет	Цел за 2016	Степен на изпълнение спрямо 2016	Оперативни програми	Цел за 2016	Степен на изпълнение спрямо 2016	Други международни финансови източници	Цел за 2016	Степен на изпълнение спрямо 2016	Частно финансиране	Цел за 2016	Степен на изпълнение спрямо 2016	Цел за 2016	Степен на изпълнение спрямо 2016	Приватизация
	/млн. лв/	/млн. лв/	%	/млн. лв/	/млн. лв/	%	/млн. лв/	/млн. лв/	%	/млн. лв/	/млн. лв/	%	/млн. лв/	/млн. лв/	%	/млн. лв/	%	/млн. лв/
Градове и фокуси на растеж	2017,00	6339,23	31,82	12912,00	5554,61	232,46	18851,00	30755,89	61,29	706,00	1000,00	70,60	3215,00	12881,36	24,96	118		
Села и периферни територии	945,00	11337,19	8,94	2377,00	4422,83	53,74	988,00	2650,50	97,28	705,50	6065,00	11,63	437,00	1549,57	28,91	649		
Равни възможности	1687,40	1920,90	87,84	1349,00	6107,93	22,09	14511,00	30705,59	47,26	6462,00	150,00	4308,00	0,00	0,00	-	33		
Ресурси и продукция	157,00	6454,28	2,43	3540,00	16433,66	21,54	824,00	86915,76	0,98	4818,00	875,00	550,63	952,00	10480,48	3,36	0		
Наследство и туризъм	2121,00	1750,84	121,14	1648,00	2182,78	75,50	0,00	13142,63	0,00	9207,00	2802,39	328,54	11,00	1347,83	0,82	74		
Управление, партньорства и връзки	44,00	1913,96	2,30	0,00	1176,46	0,00	315,00	11289,80	2,79	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0		
Общо	6971,40	29716,40	23,46	24826,00	35878,29	60,83	35489,00	172460,18	20,58	21898,50	10892,39	201,04	4015,00	26253,22	15,29	868		

4.3. ОБОБЩЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПР

Към момента, изпълнението на ОПР се осъществява чрез дейността на отделните ресурси на общинска администрация при координиращата роля на дирекция „Проекти и програми“. Сред приложените инструменти за изпълнение и наблюдение на ОПР се открояват годишните отчети за Мандатната програма. Прави впечатление, че малкият набор на приложените инструменти е свързан с обща ефективност на плана и много висока ефективност за три от приоритетите. От друга страна, разширяването на набора инструменти ще даде възможности за оптимизиране на резултатите и тяхното регулярно докладване. Възможностите за подобрене на ефикасността на влаганите организационни ресурси е представена в т. 5.

4.4. ОПИСАНИЕ НА СЪОТВЕТВИЕТО МЕЖДУ РАЗХОДИТЕ И ОЧАКВАНИТЕ ПОЛЗИ

Въпреки, че планираните проекти и разходи остават повече от реално изпълнените към края на 2016 г., отчетените проекти и инициативи (т. 2.2) и индикатори (т. 3.2) показват висока резултатност в изпълнението на ОПР, обвързана с подобрени показатели за общинското развитие. Анализираният проекти и инициативи в Община Велико Търново имат пълно съответствие със стратегията на ОПР, като по отделно допринасят за различните мерки на плана. Малък брой мерки остават без покритие с конкретни усилия през първата половина от изпълнението на ОПР. Всичко това дава основание да се даде положителна оценка относно съотношението между направените разходи и очакваните/постигнатите ползи.

5. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР

5.1. Изводи

По отношение на проектите и инициативите

- (1) значителен общ брой отчетени проекти и инициативи;
- (2) голям брой проекти на стойност под 10 хил. лв.;
- (3) по-ниска степен на общо изпълнение поради забавяне в графиците на оперативните програми и нереалистично високи обеми на проекти от ИПГВР на град Велико Търново;
- (4) небалансираност между изпълнението на отделните приоритетни области;
- (5) висока степен на изпълнение на приоритетни области „Градове и фокуси на растеж“, „Равни възможности“ и „Наследство и туризъм“;
- (6) ограничено изпълнение на приоритети „Села и периферни територии“, „Ресурси и продукция“ и „Управление, партньорства и връзки“;
- (7) съществен принос в общото финансово изпълнение от приоритетни области „Градове и фокуси на растеж“, „Равни възможности“ – 68%.
- (8) ПО „Управление, партньорства и връзки“ остава без остойностен принос към изпълнението на ОПР;
- (9) по-ниска степен на изпълнение за някои приоритети и мерки поради липсата на приложим източник на финансиране през отчетния период;
- (10) висока приемственост между заложените проекти в Програмата за реализация на ОПР и изпълненото в ПО „Равни възможности“;
- (11) отчетлива роля на собствените средства и централния бюджет за поддръжка на техническата и образователната инфраструктура, както и за културния живот;
- (12) много висока активност на Община Велико Търново в трансгранични партньорства;
- (13) малък брой партньорски проекти между общинска администрация, неправителствения и частния сектор;
- (14) липса на междуобщински проекти в рамките на област Велико Търново;

По отношение на индикаторите

- (1) висока степен на изпълнение на целите и приоритетите на ОПР според отчетените индикатори;
- (2) добро общо социално-икономическо състояние в общината;
- (3) по-слабо изпълнение за Стратегическа цел 3: „Подобрена жизнена среда в градовете и селата, обезпечени с качествени публични услуги и добро управление“ следствие на характерния национален дефицит на средства за обновяване на технически инфраструктури;

По отношение на наблюдението и изпълнението на ОПР

- (1) Детайлно отчитане за изпълнението на общинските политики на годишна основа – годишни отчети на Мандатната програма на кмета на общината;

- (2) Приложение на ограничен набор за планиране и регулярно отчитане изпълнението на ОПР;
- (3) умело използване и съчетаване на различни източници на финансиране за изпълнението на ОПР.

5.2. ФОРМУЛИРАНЕ НА ПРЕПОРЪКИ

По отношение на съдържанието на ОПР

- (1) Необходимо е приоритизиране на проекти от Програмата за реализация на ОПР;
- (2) Необходимо е ревизиране на обхвата от мерки на приоритетните области и по-специално на трите области с ограничено изпълнение.

Двете основни препоръки могат да бъдат изпълнени чрез Актуализация на ОПР или чрез разработването на годишни планове за изпълнение на ОПР, които дефинират приоритетните дейности за предстоящата година. Във втория случай ще се запази по-нисък процент на финансово изпълнение към 2020 г.

По отношение на наблюдението и изпълнението на ОПР

Междинната оценка позволява да се посочат ключови проекти и мерки, които ще оптимизират изпълнението на общинския план през следващите години. На практика, това са проследените неосъществени проекти и инициативи към края на 2016 г., систематизирани в т. 2.2. Тяхното многообразие, в комбинация с останалите направени констатации, са обобщени в следните препоръки за ключови дейности по изпълнението на приоритетните области:

- (1) ПО „Градове и фокуси на растеж“ – постигане на синергия между инвестиции за градска среда от ПО1 на ОПРР, общинския и централния бюджет; осигуряване на ресурси за емблематични градски проекти като регенерацията на Старото военно училище; постигане на синергия между публични и частни проекти в индустриалните зони; обновяване и изграждане на спортни площадки; довършителни ремонтни дейности по ДКС „Васил Левски“; разработване на партньорски проекти между общинска администрация, университети и бизнес, включително по ОПНОИР 2014-2020;
- (2) ПО „Села и периферни територии“ – изпълнение на проекти по Програмата за реализация на ОПР; реконструкция на общински път към Никополис ад Иструм; обновяване на здравни и училищни сгради с висока пълняемост на паралелките; провеждане на кампания за привличане на инвестиции в селата по отношение на селското стопанство и туризма; мобилизиране на ресурси за обновяване на водоснабдителни системи;
- (3) ПО „Равни възможности“ – продължаване на успешната практика за деинституционализация на социалните грижи, вкл. чрез изграждане на обекти от резидентен тип и използване на ПО „Регионална социална инфраструктура“ от ОПРР 2014-2020; подобряване на условията за професионално образование; обновяване на образователни обекти по Програмата за реализация на ОПР;
- (4) ПО „Ресурси и продукция“ – разработване на ВиК проекти по ОПОС 2014-2020 и съгласно Програмата за реализация на ОПР; осигуряване на инвестиции за енергийна ефективност при възможности за външно за общината финансиране;

(5) ПО „Наследство и туризъм“ – осигуряване на разнообразни източници на финансиране за консервация и реставрация на културни ценности, вкл. по ПО „Регионален туризъм“ на ОПРР 2014-2020 и след оценка и приоритизиране на обекти в общината; гарантиране на синергия между инвестиции в културни ценности и интервенциите по проектно предложение „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по ПО1 на ОПРР; доизграждане на системата за туристическа информация и ориентация;

(6) ПО „Управление, партньорства и връзки“ – разработване на публично достъпна ГИС платформа с интегрирана информация за устройството на територията, инвестиционните възможности, културното наследство и др.; разработване на партньорски проекти и модели за развитие, включително ПЧП.

Препоръките за разширяване на набора от инструменти са:

(1) разработване на годишни планове за действие по звена и дирекции, които задължително съдържат раздел с проекти/инициативи с принос към ОПР;


(2) изготвяне на годишни доклади по дирекции с единен и предварително определен стандарт за отразяване на проекти и индикатори от ОПР. Минимална предпоставка е утвърждаването на единна структура за отчитане на изпълнените проекти. Примерен модел е структурата на Приложение №1. Списък с проектите в община Велико Търново;

(3) консолидиран доклад за изпълнението на ОПР и Мандатната програма;

(4) утвърждаване на разработените документи от заседания на работна група към общинска администрация;

(5) Осигуряване на информация и публичност. Интернет портала на община Велико Търново регулярно предоставя информация за актуални политики, планове, програми и проекти в общината. Наблюдава се акцент върху публикуването на информация за определени сектори и проекти с европейско финансиране. Възможно подобрене е свързано с предоставянето на равномерно количество информация за всички сектори, както и за всички изпълнени проекти, независимо от източника на финансиране. Други приложими инструменти за публичност са създаването на обществен съвет за развитие и периодични обществени обсъждания за цялостното развитие в общината. Съветът може да се състои от ключови партньори на Община Велико Търново и да заседава във връзка с разработените консолидирани планове/доклади за изпълнението на ОПР и Мандатната програма. Обществените обсъждания могат да се структурират като форум от различни панели, посветени на дадена актуална тема/приоритетна област.

Фигура 8. Препоръки за изпълнение и наблюдение на ОПР

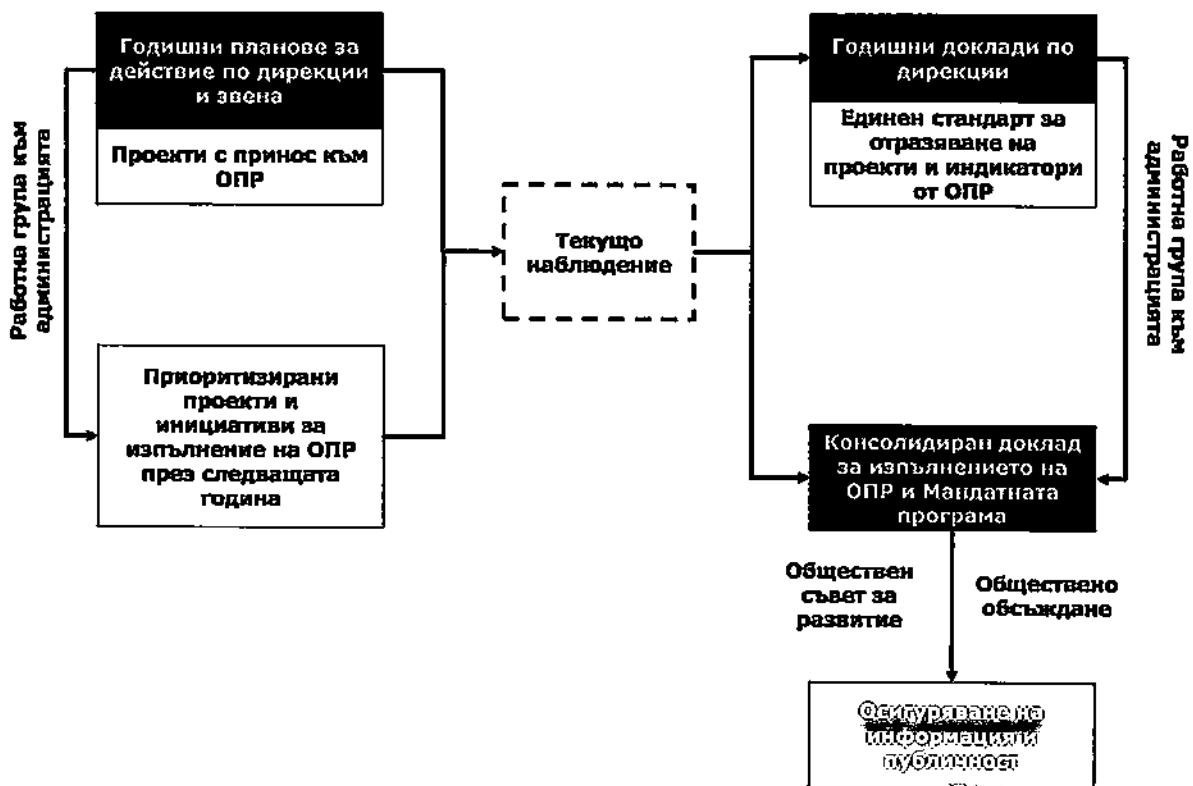

Приложение №1. Списък с проектите в община Велико Търново

Наименование на проекта/договора	Съответствие с проект от ОПР	Принос към ОПР	Стойност на проекта /хил. лв./	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Отговорник/ Бенефициент	Партньори	Година
РЕАЛИЗИРАНИ/СТАРТИРАНИ ПРОЕКТИ СЪС СЪОТВЕТСТВИЕ СПРЯМО ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР							
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ГРАДОВЕ И ФОКУСИ НА РАСТЕК							
Път VTR 1010/ път I-5-ял гара Дебелец - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи.	П1.1	M1.1	32	Държавен бюджет	Община Велико Търново		
Рехабилитация и реконструкция на общински път VTR1010 (I-5)/ Дебелец – ял гара Дебелец – В.Търново, кв. Чолаковци – В.Търново, ул. „Сан Стефано“ /GAB3110/ от км. 0+210 до км. 1+581.“	П1.1	M1.1	624	Държавен бюджет	Община Велико Търново		
Магояване на проект за реконструкция и топлоизолация на външните стени (E1), външен под (E2), покриви (E3) и подмяна на дограмата (E4) на ДКС "Васил Левски"	П1.17	M1.4 M1.6	12	Общински бюджет	Община Велико Търново		
Дворец на културата и спорта "Васил Левски" - основен ремонт ниско тавло стада	П1.17	M1.4 M1.6	10	Общински бюджет	Община Велико Търново		
Дворец на културата и спорта "Васил Левски" –частичен ремонт	П1.17	M1.4 M1.6	10	Приватизация	Община Велико Търново		
Осигуряване на безплатен интернет WLAN във всички великотърновски паркове	П1.22	M1.6	2	Общински бюджет	Община Велико Търново		
Реконструкция и модернизация на итралното поле и лекоатлетическа писта на стадион „Ивайло“ гр. Велико Търново – II етап"	П1.23	M1.6	2 421	Държавен бюджет - 2 420 Общински бюджет - 1	Община Велико Търново		
Завършване и откриване на обект "Мултифункционална спортна зала към СОУ "Ем.Станев" - гр. Велико Търново"	П1.24	M1.6	738	Държавен бюджет - 703 Общински бюджет - 35	Община Велико Търново		
Магредени нови и подновени детски площадки на ул.Освобождение№131 и в ДГ "Слънчев дом"	П1.26	M1.6		Общински бюджет	Община Велико Търново		

Наименование на проекта/договора	Съответствие с проект от ОПР	Принос към ОПР	Стойност на проекта /хил. лв./	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Отговорник/Бенефициент	Партньори	Година		
							14	15	16
Изграждане на нови детски площадки в кв. Чолаковци, в парк „Никола Габровски“, в кв. Асенюв.	П1.26	М1.6	66	Общински бюджет	Община Велико Търново				
ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА "БИ САУНД" ЕООД ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА НОВИ ОЗВУЧИТЕЛНИ И ОСВЕТИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА, И ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ	П1.30	М1.2	349	ОПИК - 244 Частно съфинансирание - 105	Частен сектор				
Подобряване на производствения капацитет на "Валда 90" ООД	П1.30	М1.2	1 408	ОПИК - 845 Частно съфинансирание - 563	Частен сектор				
Пасивно-оптична свързаност	П1.30	М1.2	605	ОПИК - 363 Частно съфинансирание - 242	Частен сектор				
Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на Кармела 2000 ООД	П1.30	М1.2	1 657	ОПИК - 994 Частно съфинансирание - 663	Частен сектор				
Подобряване на производствения капацитет на Колос ЕООД	П1.30	М1.2	1 071	ОПИК - 750 Частно съфинансирание - 321	Частен сектор				
Технологична модернизация на фирма Машпроект - 94 ООД	П1.30	М1.2	608	ОПИК - 426 Частно съфинансирание - 182	Частен сектор				
Подобряване на производствения капацитет и увеличаване на обема на износа в "ПЛАСТИКО" ООД	П1.30	М1.2	539	ОПИК - 377 Частно съфинансирание - 162	Частен сектор				

Наименование на проекта/договора	Отговорник/ бенефициент	Партньори	Година	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Частен сектор	Стоиност на проекта /хил. лв./	Принос към ОНР	Съответствие с проект от ОНР	М1.2	М1.10	М2.5	М2.5	М2.5	М2.5	М2.5	М2.5	М2.5	М2.5	М2.5
Инвестиции в производствения капацитет на СЕЛТИС ООД - Велико Търново	Частен сектор			ОПИК - 95 Частно финансиране - 41	Частен сектор	136	M1.2	P1.30											
Капацитет	Частен сектор			ОПИК - 749 Частно финансиране - 321	Частен сектор	1 070	M1.2	P1.30											
Въвеждане на адаптивна система повишаване на капацитета на А Дейта Про за обработка на потоци от данни за производството на знание-интензивни продукти и услуги	Частен сектор			ОПИК - 785 Частно финансиране - 524	Частен сектор	1 309	M1.10	P1.31											
Подобряване на конкурентността и разширяване на капацитета на фирма „Софтгруп“ ООД за разработване и внедряване на интелигентни софтуерни решения	Частен сектор			ОПИК - 213 Частно финансиране - 91	Частен сектор	304	M1.10	P1.31											
Радиопредавател за ефирно излъчване за нуждите на ОП "Общинско изобелно радио - Велико Търново"	Община Велико Търново			Общински бюджет	Община Велико Търново	4	-	P1.33											
Самозодене /Аварийно - ремонтни работи на здравна служба/	Община Велико Търново			Общински бюджет	Община Велико Търново	12	M2.5	P2.17											
Основен ремонт на котел в Дома за възрастни хора с умствена изостаналост с. Пчелище	Община Велико Търново			Общински бюджет	Община Велико Търново	21	M2.5	P2.23											
Перални за нуждите на Дом за възрастни с умствена изостаналост - с. Пчелище	Община Велико Търново			Общински бюджет	Община Велико Търново	14	M2.5	P2.23											
Ремонт сгради общинска собственост на територията на кметствата и кметските наместничества - Арбанаси /Укрепване сграда пенсионерски клуб/	Община Велико Търново			Общински бюджет	Община Велико Търново	14		P2.25											

Наименование на проекта/договора	Съответствие с проект от ОПР	Принос към ОПР	Стойност на проекта /хил. лв./	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Отговорник/Бенефициент	Партньори	Година		
							14	15	16
Ремонт сгради общинска собственост на територията на кметствата и кметските наместничества -Можин сбор	П2.26		4	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Основен ремонт ЦДГ с. Присово	П2.42	M2.9	3	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Ремонт на покривна конструкция на Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Церова кория	П2.43	M2.5 M2.9	45	Общински бюджет	Община Велико Търново				

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Бъдеще за всяко дете	П3.2	M3.1	307	ОПРЧР	Община Велико Търново				
Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“	П3.2	M3.1	653	ОПРЧР	Община Велико Търново				
Домашен социален патронаж, гр. Дебелец - подмяна на дограма	П3.4	M3.2	4	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Основен ремонт на кухненски блок Дом за стари хора, гр. В. Търново	П3.5	M3.2	13	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Изграждане на пожарозвездителна инсталация в Дом за стари хора „Венета Ботева“ гр. В. Търново	П3.5	M3.2	15	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Внедряване на мрежи за енергийна ефективност чрез преустройство на вътрешните отоплителни инсталации и прилежащи съоръжения в Дом за стари хора „Венета Ботева“	П3.5	M3.2	122	Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.	Община Велико Търново				
„Обществена тралезария – Велико Търново“	П3.8	M3.4	22	Държавен бюджет, чрез Фонд „Социална закрила“ към	Община Велико Търново				

Наименование на проекта/договора	Съответствие с проект от ОПР	Принос към ОПР	Стойност на проекта /хил. лв./	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Отговорник/Бенефициент	Партньори	Година		
							14	15	16
				МТСП					
„Осигуряване на топъл обяд в Община Велико Търново“ BG05FMOP001-3.002-0023-C01	ПЗ.8	МЗ.4	11	„Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“ Държавен бюджет, чрез фонд „Социална закрила“ към МТСП	Община Велико Търново	Агенция за социално подпомагане			
„Обществена трапезария – Велико Търново“	ПЗ.8	МЗ.4	11		Община Велико Търново				
Проект „МОСТОВЕ КЪМ СВЕТА“ за осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства	ПЗ.9	МЗ.4	22	ЦОИДУЕМ	Община Велико Търново				
По проект „ЦВЕТНА ФАНТАЗИЯ“ за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства	ПЗ.9	МЗ.4	16	ЦОИДУЕМ	Община Велико Търново				
Проект „БЛИЗО ЕДИН ДО ДРУГ“ за осигуряване на по-високо ниво на образованост на учениците от ромски и турски етноси	ПЗ.9	МЗ.4	22	ЦОИДУЕМ	Община Велико Търново				
Проект „БОГАТСТВО НА РАЗЛИЧИЯТА“ за развиване на разнообразни форми на интеркултурно образование, насочено към залавяване и развитие на културната идентичност на етническите малцинства при деца и ученици	ПЗ.9	МЗ.4	16	ЦОИДУЕМ	Община Велико Търново				
Осигуряване на условия и ресурси за надраждане и развитие на подкрепяща следа в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение	ПЗ.9	МЗ.4	39	ОПНОИР	Община Велико Търново				
Проект „Гъвят към по-добро бъдеще минава през училището“ за осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства	ПЗ.9	МЗ.4	9	ЦОИДУЕМ	Община Велико Търново				

Наименование на проекта/Договора	Съответствие с проект от ОПР	Принос към ОПР	Стойност на проекта /хил. лв./	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Отговорник/Бенефициент	Партньори	Година		
							14	15	16
Проект „Партньорство-Успех-Устойчивост“ за създаване на благоприятна среда в училище за привличане и задържане на децата от етническите малцинства	ПЗ.9	МЗ.4	14	ЦОИДУЕМ	Община Велико Търново				
„Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за лица с лека степен на умствена изостаналост в град Велико Търново“	ПЗ.16	МЗ.3	166	Красива България	Община Велико Търново				
Проект „Нови възможности за грижа“	ПЗ.21	МЗ.4	377	ОПРЧР	Агенция за социално подпомагане	Община Велико Търново			
Проект „Подкрепа за независим живот“	ПЗ.22	МЗ.4	500	ОПРЧР	Община Велико Търново				
Проект „Прими ме – 2015“	ПЗ.23	МЗ.4	460	ОПРЧР	Агенция за социално подпомагане	Община Велико Търново			
Проект „Обуменка и заетост за младите хора“	ПЗ.31	МЗ.5	276	ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.	Община Велико Търново	Агенция по заетостта, Главна Дирекция „Услуги по заетостта“			
Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“ 2014 г.	ПЗ.36	МЗ.5	71	Държавен бюджет	Община Велико Търново	Агенция по заетостта, ДБТ Велико Търново			
Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“ 2015 г.	ПЗ.26	МЗ.5	13	Държавен бюджет	Община Велико Търново	Агенция по заетостта, ДБТ Велико Търново			
Регионална програма за заетост – 2014 г.	ПЗ.37	МЗ.5 МЗ.6	13	Държавен бюджет	Община Велико Търново	Агенция по заетостта, ДБТ Велико Търново			

Наименование на проекта/договора	Съответствие с проект от ОПР	Принос към ОПР	Стойност на проекта /хил. лв./	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Отговорник/Бенефициент	Партньори	Година		
							14	15	16
Регионална програма за заетост – 2015 г.	ПЗ.37	МЗ.5 МЗ.6	13	Държавен бюджет	Община Велико Търново	Агенция по заетостта, ДБТ Велико Търново			
Регионална програма за заетост – 2016 г.	ПЗ.37	МЗ.5 МЗ.6	18	Държавен бюджет	Община Велико Търново	Агенция по заетостта, ДБТ Велико Търново			
Проект „Шанс за работа – 2014 г.“	ПЗ.38	МЗ.5 МЗ.6	7	Държавен бюджет	Община Велико Търново	Агенция по заетостта ДБТ Велико Търново РС на КНСБ – гр. В. Търново			
Проект „Шанс за работа – 2015 г.“	ПЗ.38	МЗ.5 МЗ.6	16	Държавен бюджет	Община Велико Търново	Агенция по заетостта ДБТ Велико Търново РС на КНСБ – гр. В. Търново			
Проект „Шанс за работа – 2016 г.“	ПЗ.38	МЗ.5 МЗ.6	6	Държавен бюджет	Община Велико Търново	Агенция по заетостта ДБТ Велико Търново РС на КНСБ – гр. В. Търново			
Програма „Клио“ 2015 г.	ПЗ.38	МЗ.5 МЗ.6	11	Държавен бюджет	Община Велико Търново	Агенция по заетостта, ДБТ Велико Търново			

Наименование на проекта/ Договора	Съответствие с Проект от ОПР	Принос към Проект от ОПР	Стоимост на проекта /кв. лв./	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Отговорник/ Бенефициент	Партньори	Година		
							14	15	16
Национална програма „Клио“ 2016 г.	ПЗ.38	МЗ.5 МЗ.6	6	Държавен бюджет	Община Велико Търново	Агенция по заетостта, ДБТ Велико Търново			
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица	ПЗ.38	МЗ.5 МЗ.6	5	Държавен бюджет	Община Велико Търново	Агенция по заетостта, ДБТ Велико Търново			
Национална програма „Активиране на неактивни лица“	ПЗ.38	МЗ.5 МЗ.6	19	Държавен бюджет	Община Велико Търново	Агенция по заетостта, ДБТ Велико Търново			
Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново“ с обхват СОУ „Емилиан Станев“, ОУ „П.Р.Славейков“, ОУ „Патриарх Евтимий“, ПМГ „Васил Друмев“ и ОУ „Неофит Рилски“ в град Килифарево	ПЗ.45	МЗ.7	3 800	НДФФ - 3 610 Собствено съфинансиране - 190	Община Велико Търново				
„Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Д-р Петър Берон“ гр. Дебелец	ПЗ.46	МЗ.7	297	Държавен бюджет - 252 Общински бюджет - 45	Община Велико Търново				
Неотложен частичен ремонт на покрива на ОУ „Димитър Благоев“ гр. Велико Търново	ПЗ.49	МЗ.7	15	Общински бюджет	Община Велико Търново				
ЦДГ „Надежда“, гр. Килифарево - Отоплителен котел	ПЗ.52	МЗ.7	10	Общински бюджет	Община Велико Търново				
ЦДГ „Пламъче“, гр. Дебелец - нафтова горелка	ПЗ.53	МЗ.7	6	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Вътрешен ремонт на ВК инсталация в сградата на детското заведение и направа на външен дренаж и ремонт на пропаднали настилки около сградата на детска ясла „Слънце“, гр. Велико Търново	ПЗ.56	МЗ.7	53	Общински бюджет	Община Велико Търново				

Наименование на проекта/договора	Съответствие с проект от ОПР	Принос към ОПР	Стойност на проекта /мл. лв.	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Отговорник/Бенефициент	Партньори	Година		
							14	15	16
Програма "СМНДМ" - Зона Велико Търново за обучение на специалисти в образователните заведения	ПЗ.59	МЗ.8			Община Велико Търново				
Изпълнение на проект "Art Nouveau- Art Repoucheau" в СОУ "Емилян Станев"	ПЗ.59	МЗ.8	100	Еразъм+	Община Велико Търново				
Проект "Разширяване на европейското измерение на образователния процес в СОУ "Вела Благоева" чрез професионално развитие на учителите"	ПЗ.59	МЗ.8	31	Еразъм+ - 29 Собствено съфинансиране - 2	Община Велико Търново				
Повишаване квалификацията на педагогическия персонал в СОУ "Емилян Станев"	ПЗ.59	МЗ.8	3	ТТС	Община Велико Търново				
Програма „Квалификация на педагогическите специалисти“	ПЗ.59	МЗ.8	20	Държавен бюджет	Община Велико Търново				
По програма „Добре Дошли в училище за съвместна дейност между родители, учители и ученици	ПЗ.59	МЗ.8	5	ЦОИДУЕМ	Община Велико Търново				
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ РЕСУРСИ И ПРОДУКЦИЯ									
Общински път VTR 1004 "Велико Търново - Беляковец" и общински път VTR 1012 "III-504 - с.Водолей - с.Дичинг"	П4.18	М4.5	392	Държавен бюджет	Община Велико Търново				
Оптимизиране на производствената верига и ресурсното потребление в ЕТ „МУЛТИИИЖЕНЕРИНГ - ИВАНКА АНГЕЛОВА“	П4.24	М4.9	585	ОПИК - 410 Частно съфинансиране - 175	Частен сектор				
Разширяване на капацитета и експортния потенциал на САНИ ЕООД чрез внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес	П4.24	М4.9	591	ОПИК - 414 Частно съфинансиране - 177	Частен сектор				

Наименование на проекта/договора	Съответствие с проект от ОПР	Принес КММ	ОПР	Стойност на проекта /хил. лв./	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Отговорник/Бенефициент	Партньори	Година
								14 15 16

ПРИОРИТЕНА ОБЛАСТ НАСЛЕДСТВО И ТУРИЗЪМ

Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие" 24-10M1-44/23.04.2015	П5.4	M5.5 M5.6		725	Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, ФМЕИП	Община Велико Търново		
Аварийно - възстановителни работи комплекс Балдуинова кула и туристическа алея	П5.4	M5.6		30	Общински бюджет	Община Велико Търново		
Възстановяване на пешеходни алеи и площадки за наблюдение на хълм Царевец	П5.4	M5.6		4	Общински бюджет	Община Велико Търново		
Комплексно проектиране на обект "Шишманова баня" - консервация, реставрация и експониране със защитно покритие	П5.4	M5.6		13	Общински бюджет	Община Велико Търново		
Аварийно - възстановителни работи комплекс Балдуинова кула и туристическа алея 2 етап	П5.4	M5.6		25	Общински бюджет	Община Велико Търново		
Консервация, реставрация и експониране на западна крепостна стена на хълм "Трапезица"	П5.4	M5.6		9	Общински бюджет	Община Велико Търново		
Експозиционно обновяване на трите църкви със стенописи №10, №6, и №13, Хълм "Трапезица"	П5.4	M5.6		5	Общински бюджет	Община Велико Търново		
Изграждане на стълбище от алея до каса на АМР "Трапезица", РИМ ВТ	П5.4	M5.6		12	Общински бюджет	Община Велико Търново		
Изграждане на покритие на функционалър на архитектурен резерват "Трапезица"	П5.4	M5.6		12	Общински бюджет	Община Велико Търново		
Проектиране на Аварийно - възстановителни и укрепителни работи в АМР ЦАРЕВЕЦ, проект „Южна напречна крепостна стена с кула“	П5.4	M5.6			Общински бюджет	Община Велико Търново		
Осигуряване на художествено осветление на АМР „Трапезица“.	П5.4	M5.6			Общински бюджет	Община Велико Търново		
Възстановяване на църковна страда "Успение Пресвета Богородица", гр. Килифарево	П5.5	M5.6		79	Държавен бюджет	Община Велико Търново		

Наименование на проекта/договора	Съответствие с проект от ОПР	Принос към ОПР	Стойност на проекта /хил. лв./	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Отговорник/Бенефициент	Партньори	Година		
							14	15	16
Въстановяване на църковна сграда "Успение Пресвета Богородица", гр. Килифарево 2 етап	П5.5	М5.6	125	Държавен бюджет	Община Велико Търново				
Изготвяне и съгласуване с МК на проекти за неотложни аварийно-възстановителни работи за храм „Св. Богородица“, гр.Килифарево	П5.5	М5.6		Общински бюджет	Община Велико Търново				
Основен ремонт покрив Мултимедийен посетителски център	П5.13	М5.12	54	Приватизация	Община Велико Търново				
Провеждане на национални и международни фестивали	П5.20	М5.7	803	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Разработване на концепция и сценарий на аудио-визуален спектакъл „Асеневи“.	П5.20	М5.12		Общински бюджет	Община Велико Търново				
Придобиване на програмни продукти във връзка с "Аудио-визуална програма Царевград търнов-Звук и светлина"	П5.20	М5.12	11	Общински бюджет	Община Велико Търново				
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПАРТНЬОРСТВА И ВРЪЗКИ									
Въвеждане на 13 е-услуги в направленията Административни услуги "Местни данъци и такси"; Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне; Административни услуги "Устройство на територията"	П6.1	М6.1		Общински бюджет	Община Велико Търново				
Въвеждане на нови модули и функционалности към платформата е-Община Велико Търново - Модул за достъп до услуги; Софтуерна платформа за управление на бизнес процеси и електронни документи Архимед; Надграждане на модул „Профил на купувача“; Надграждане на платформа е-Община Велико Търново с модул за SMS парижане; Модул „Инвестиционен справочник“	П6.1	М6.1	21	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Актуализиране на съществуващите и въвеждане на нови модули и функционалности към платформата е-Община Велико Търново - въвеждане на модулите Информационна система на Общински съвет (ИСОС); е-Регион Велико Търново	П6.1	М6.1	23	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Разработване на Система за управление на детските градини	П6.1	М6.1		Общински бюджет	Община Велико Търново				

Наименование на проекта/договора	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Отговорник/Бенефициент	Партньори	Година		
				14	15	16
Съответствие с проект от ОПР	Принос към ОПР	Стойност на проекта /мл. лв./	Источници на финансиране, вкл. разпределение	Отговорник/Бенефициент	Партньори	Година

РЕАЛИЗИРАНИ/СТАРТИРАНИ ПРОЕКТИ С ПРИНОС КЪМ МЕРКИТЕ НА ОПР

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ГРАДОВЕ И ФОКУСИ НА РАСТЕЖ

Реконструкция на път /Път-4/- Западен пътен възел - ул. "Беляковско шосе" - гробищен парк Велико Търново - Беляковец	153	Държавен бюджет	Община Велико Търново			
"Възстановяване на функционирането на инфраструктурата в сферата на транспорта и осигуряване на превативна инфраструктура на територията на община Велико Търново" 2014BG156SP0001-010	706	Фонд "Солидарност" на ЕС	Община Велико Търново			
Камънен мост над р. Белица, гр. Дебелец - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи	22	Държавен бюджет	Община Велико Търново			
Ремонт на тротоарна мрежа в гр. Велико Търново в централната градска част - ул. "Васил Левски", ул. "България", ул. "Никола Габровски"; в кв. Бузлуджа-Зона В " ул. "Драган Цончев"; ул. " Тодор Иванов", ул. "Васил Златарски", ул. " Стоян Коледаров", ул. " Венета Боева", в квартал "Картала" : ул. "Димитър Буйнозов" южен участък и ул. "Стоян Михайловски" /ПМС№113/30.04.2015 г./	966	Държавен бюджет	Община Велико Търново			
Реконструкция на улична мрежа в град Велико Търново - 2014	822	Държавен бюджет - 611 Общински бюджет - 211	Община Велико Търново			
Реконструкция на улична мрежа в град Велико Търново - 2015	511	Държавен бюджет	Община Велико Търново			
Изграждане на улици в квартал "Колно Фичето" - улиците "Асти"; "Твер"; "Серес"; "Толедо" и в квартал "Картала" - ул. "Д.Буйнозов" - /ПМС№113/30.04.2015 г./	1 034	Държавен бюджет	Община Велико Търново			
Основен ремонт на улична осветителна мрежа в гр. В. Търново /Решение 1457/09.03.2015 г./	19	Приватизация	Община Велико Търново			

Наименование на проекта/Договора	Съответствие с проект от ОТР	Принос към ОТР	Стойност на проекта /хил. лв./	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Отговорник/ Бенефициент	Партньори	Година		
							14	15	16
Ремонт на улици и тротоари в гр. Велико Търново - ПМС 192/29.07.2016 г.		M1.1	909	Държавен бюджет	Община Велико Търново				
Ремонт на улици и тротоари в гр. Велико Търново - ПМС 261/07.10.2016 г.		M1.1	881	Държавен бюджет	Община Велико Търново				
Изграждане на нова улична осветителна мрежа в гр. В. Търново /в т.ч. по Решение 1457/09.03.2015 г./		M1.1	117	Общински бюджет - 53 Приватизация - 64	Община Велико Търново				
Реконструкция на улична мрежа и довършителни строителни дейности на парк в кв. "Чолаковци".		M1.1	1 256	Държавен бюджет - 1 231 Приватизация - 25	Община Велико Търново				
Ремонт на улици и тротоари в гр. Велико Търново - ПМС 192/29.07.2016 г. 2 етап		M1.1	91	Държавен бюджет	Община Велико Търново				
Ремонт на улици и тротоари в гр. Велико Търново - ПМС 261/07.10.2016 г. 2 етап		M1.1	119	Държавен бюджет	Община Велико Търново				
Реконструкция улична мрежа-тротоари и стълбища в град Велико Търново		M1.1	66	Държавен бюджет	Община Велико Търново				
Възстановяване на ул. "Трапезица" и извършване на укрепителни мероприятия на славчище на №VTR 04.10447.28 над ул. "Трапезица" (северно откъм хълм "Трапезица", гр. В. Търново)- ПМС 115/10.05.2016г.		M1.1	363	Държавен бюджет - 350 Общински бюджет - 13	Община Велико Търново				
Основни ремонти на следните стълбища и стълбищни площи в гр.В.Търново - ул."Белчеви", ул."Негованка", стълбището от ул."Мир" до ул."Закари Стоянов" за ПМГ и др		M1.1		Общински бюджет	Община Велико Търново				
Подобряване на хоризонталната и вертикалната пътна сигнализация в община Велико Търново		M1.1	292	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Текущи ремонти за подобряване на експлоатационното състояние на улична мрежа на гр. Велико Търново		M1.1	900	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Ремонтни дейности на отделни увредени участъци на тротоарните настилки в гр.Велико Търново		M1.1	136	Общински бюджет	Община Велико Търново				

Наименование на проекта / договора	Съответствие с проект от ОПР	Присоединение към ОПР	Стойност на проекта / хил. лв.	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Отговорник/ Бенефициент	Партньори	Година		
							14	15	16
Извършен ремонт и изграждане на уличното осветление на обекти в град Велико Търново		M1.1 M1.5	121	Общински бюджет	Община Велико Търново				
ПУП-ПРЗ Нов градски център из гр. В. Търново		M1.4	20	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Гримьорни и санитарен възел за Летен театър в парк "Марно поле"		M1.6	18	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Реконструкция и модернизация на стадион „Ивайло – север-юг“ гр. Велико Търново		M1.6	2 189	Държавен бюджет	Община Велико Търново				
Открит спортно тренировъчен комплекс УПИ IX за спорт и подземни гаражи в кв. 28 в гр. В. Търново-Етап 1		M1.6	21	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Спортна площадка и сграда в парк "Картала", находяща се в УПИ I - за парк, кв. 377 по плана на гр. В. Търново		M1.6	3	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Изграждане на обезопасителна ограда на скейтбордна площадка на ул. „Проф. Илия Якулов“		M1.6	6	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Провеждане на събития, участие на форуми и изложения за популяризиране на община Велико Търново като място за инвестиции и туризъм		M1.11	68	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Реализиране на общински кампании за рекламиране и маркетинг на община Велико Търново		M1.11	25	Общински бюджет	Община Велико Търново				
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ СЕЛА И ПЕРИФЕРНИ ТЕРИТОРИИ									
Водосток на общински път - с. Радювци - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи		M2.1	5	Държавен бюджет	Община Велико Търново				
Път VTR 3023У път II-55 – Габровци - път, 5 бр. водосток - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи		M2.1	10	Държавен бюджет	Община Велико Търново				
Водосток - вила зона с. Габровци - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи		M2.1	4	Държавен бюджет	Община Велико Търново				

Наименование на проекта/договора	Съответствие с проект от ОПР	Принос към ОПР	Стойност на проекта /мл. лв./	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Отговорник/ Бенефициент	Партньори	Година		
							14	15	16
Път VTR 3023 Габровци-Шодековци - път, 6 бр. водостоци - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи		M2.1	18	Държавен бюджет	Община Велико Търново				
Път VTR 3023 Габровци/път II-55-Габровци - път, отводняване - спешно проектиране		M2.1	23	Държавен бюджет	Община Велико Търново				
Път с. Райковци-Цеперанице - път, 3 бр. водостоци - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи		M2.1	9	Държавен бюджет	Община Велико Търново				
Възстановяване на улици в с. Ново село - водостоци		M2.1	4	Държавен бюджет	Община Велико Търново				
Дейности по Фонд "Инициативи на местните общности" - 2014		M2.1	106	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Дейности по Фонд "Инициативи на местните общности" - 2015		M2.1	92	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Дейности по Фонд "Инициативи на местните общности" - ремонт площадно пространство по населени места		M2.1 M2.6	54	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Дейности по Фонд "Инициативи на местните общности" - мерки за енергийна ефективност сгради в населени места		M2.1	42	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Дейности по Фонд "Инициативи на местните общности" - реконструкция улици платна по населени места		M2.1	275	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Ремонт водосток с. Никоп		M2.1	4	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Изграждане на автопистреха с. Шеремета		M2.1	3	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Поддръжка на пъвеи, втори и трети клас пътища, които преминават през населени места на територията на община Велико Търново		M2.4	600	Държавен бюджет	Община Велико Търново				
Извършване и реконструкция на уличната мрежа в 28 населени места на територията на община Велико Търново - 2014		M2.4	205	Общински бюджет - 196 Приватизация - 9	Община Велико Търново				

Наименование на проекта/договора	Съответствие с проект от ОПР	Принос към ОПР	Стойност на проекта /мл. лв./	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Отговорник/ Бенефициент	Партньори	Година		
							14	15	16
Извършване и реконструкция на уличната мрежа в населени места на територията на община Велико Търново - 2015		M2.4	321	Общински бюджет - 14 Приватизация - 307	Община Велико Търново				
Извършване и реконструкция на уличната мрежа в населени места на територията на община Велико Търново - 2016		M2.4	320	Общински бюджет - 1 Приватизация - 319	Община Велико Търново				
/Път III-504/ - Водолей - Дичин - /граница община Павликени/		M2.4	406	Държавен бюджет	Община Велико Търново				
/Път II-514/ - Арбанаси - Шеремета - депо битови отпадъци - /граница община Ласковец/		M2.4	18	Държавен бюджет	Община Велико Търново				
Общински път VTR 3037 / път II-55, Килифарово - Вонеща Вода/ Вългавци - с. Дечковаци и общински път VTR 3038 /VTR 3037 Вългавци - с. Дечковаци/ - Гашевци		M2.4	39	Държавен бюджет	Община Велико Търново				
Пътен участък с асфалтово покритие от път VTR 2002 / път III-303/ - Пушево - Шемшево, от км 2+100 до км 5+600, с дължина 3,5 км		M2.4	93	Държавен бюджет	Община Велико Търново				
Общински път GAB 2110 - /граница община Дряново/ - с. Шемшево - гр. В. търново, от км 3+200 /пътно кръстовище за с. Буковец/ до км 7+600 /начало с. Шемшево/, с дължина 4,4 км		M2.4	198	Държавен бюджет	Община Велико Търново				
Пътен участък с асфалтово покритие от път VTR 3018 / път II-55/ - с. Бояновци, с местонахождение между републикански път II-55 Дебелец-Килифарово - Гурково и с. Бояновци, с дължина 2,1 км		M2.4	101	Държавен бюджет	Община Велико Търново				
Аварийно възстановяване на крайбрежна подпорна стена, представляваща устой на мост над р. Белица, с Вонеща вода		M2.4	30	Държавен бюджет	Община Велико Търново				
"Възстановяване на функционирането на инфраструктурата в сферата на транспорта и осигуряване на превентивна инфраструктура на територията на община Велико Търново"		M2.4	706	Фонд „Солидарност“ на ЕС	Община Велико Търново				

2014BG156SP0001-010

Наименование на проекта/договора	Съответствие с проект от ОПР	Принос към ОПР	Стойност на проекта /хил. лв./	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Отговорник/ Бенефициент	Партньори	Година		
							14	15	16
Аварийно възстановяване на крайбрежна подпорна стена, представляваща устой на мост над р. Белица, с. Вонеща вода 2 етап		M2.4	59	Държавен бюджет - 58 Общински бюджет - 1	Община Велико Търново				
Мост над р. Беселина и улица в с. Кълиново-разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи		M2.4	25	Държавен бюджет	Община Велико Търново				
Мост над р. Еньовица - с. Габровци, път Габровци-Търново - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи		M2.4	8	Държавен бюджет	Община Велико Търново				
Изграждане на водосток до брѳда на рака Еньовица, на пътя за с. Търново и Бойчови колиби		M2.4	11	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Мостове над дерета- с. Миндѳ - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи		M2.4	10	Държавен бюджет	Община Велико Търново				
Път ГАВ 1111 гр. Килифарово / Килифарово-Плаково - спешна актуализация на проект за каменен сводов мост		M2.4	36	Държавен бюджет	Община Велико Търново				
Възстановяване на ул.16-та и ул. 14-та, с. Миндѳ		M2.4	21	Държавен бюджет	Община Велико Търново				
Възстановяване на общински път с. Войнежа - с. Половица и на водосток в с. Войнежа		M2.4	93	Държавен бюджет	Община Велико Търново				
Възстановяване на улица с.Вонеща Вода-ОК 304-ОК 333-ОК341, ул. 7-а и ул. 9-а в с. Кълиново и общински път от с. Кълиново за местността "Стубела"		M2.4	180	Държавен бюджет	Община Велико Търново				
Килифаревски манастир-подход към манастира, пешеходен мост - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи		M2.4	43	Държавен бюджет	Община Велико Търново				
Килифаревски манастир - бряг на р. Белица в района на манастира - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни работи		M2.4	18	Държавен бюджет	Община Велико Търново				
Подпорни стени за укрепване на улица до р. Еньовица, с. Габровци-разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни работи		M2.4	19	Държавен бюджет	Община Велико Търново				

Наименование на проекта/договора	Съответствие с проект от ОПР	Принос към ОПР	Стойност на проекта /хил. лв./	Источници на финансиране, вкл. разпределение	Огзоворник/ Бенефициент	Партньори	Година		
							14	15	16
Път УТР 2016 Нацсаци-Големаните, свлачище - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи		M2.4	17	Държавен бюджет	Община Велико Търново				
Път с. Райковци-Целераните, свлачище - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи		M2.4	10	Държавен бюджет	Община Велико Търново				
Възстановяване на подпорна стена и укрепване на път УТР 3019, непосредствено след моста над р. Белица при м. 0+170 до км.0+220		M2.4	196	Държавен бюджет	Община Велико Търново				
Път УТР 2016 Големаните- Плаково, сводов водосток - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи		M2.4	10	Държавен бюджет	Община Велико Търново				
Възстановяване на път УТР1021 /път III-551/ - Велчево - Кълинковски манастир.		M2.4	8	Държавен бюджет	Община Велико Търново				
Основен ремонт на общински пътища, Общински път с. Драгижево- с Церова Кория		M2.4	36	Държавен бюджет	Община Велико Търново				
Изграждане на общински път с. Малки чифлик		M2.4	22	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Ремонт стради общинска собственост на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - 2014		M2.5	22	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Клуб на пенсионера и инвалида с. Самоводене- подмяна дограма с. Шережея - детска площадка		M2.5	3	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Ремонт на детска площадка с.Пчелище - допълнителни дейности		M2.6	8	ПУДОС	Община Велико Търново				
с. Никопл - детска площадка		M2.6	2	Приватизация	Община Велико Търново				
Ремонт площад с. Пчелище		M2.6	9	ПУДОС	Община Велико Търново				
		M2.6	6	Приватизация	Община Велико Търново				

Наименование на проекта/договора	Съответствие с проект от ОПР	Принос към ОПР	Стойност на проекта /хил. лв./	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Отговорник/Бенефициент	Партньори	Година		
							14	15	16
Развитие на миниляри за продажба на местна продукция от зеленчукопроизводители и търговци в селата Ресен, Велчево, Балван и градовете Дебелец и Килифарево		M2.11		Общински бюджет	Община Велико Търново				
Разширяване на продуктовата гама на ДИК-2000 ООД за по-добро позициониране на пазара на вафлени изделия		M2.13	1 085	ОПИК - 750 Частно съфинансиране - 335	Частен сектор				
Инвестиционен проект за подобряване на производствения капацитет и конкурентоспособността на РИТА ПЛАСТ АГРО ООД		M2.13	340	ОПИК - 238 Частно съфинансиране - 102	Частен сектор				
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ									
Текущи ремонтни дейности на здравен кабинет в ОУ „ П. Славейков“ с. Церова кория		M3.1		Общински бюджет	Община Велико Търново				
Обновяване на материалната база на здравните кабинети на територията на общината - 2014		M3.1		Общински бюджет	Община Велико Търново				
Обновяване на материалната база на здравните кабинети на територията на общината - 2015		M3.1	45	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Обновяване на материалната база на здравните кабинети на територията на общината (ДГ „Пламъче“, гр. Дебелец, ПМГ „Васил Друмев“, ОУ „Бачо Киро“, ДГ „Пролет“) - 2016 г.		M3.1	5	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Ремонт и реконструкция ограда и вход на ДЯ „Пролет“		M3.1	0,4	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Модернизирване на мъжеско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж - В. Търново		M3.2	21	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Обзавеждане и оборудване на Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост, гр. В. Търново, ул. "Н. Габровски" №49		M3.2	2	Общински бюджет	Община Велико Търново				

Наименование на проекта/договора	Съответствие с проект от ОПР	Принес КМ	Стоиност на проекта /хил. лв./	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Отговорник/Бенефициент	Партньори	Година
							14 15 16
Оборудване на обекти от социалната инфраструктура, вкл. компютри и хардуер		М3.2	25	Общински бюджет	Община Велико Търново		
Дневен център за деца с увреждания, гр. В. Търново - Основен ремонт на подход към входа		М3.2	7	Общински бюджет	Община Велико Търново		
Достъп до нови качествени работни места в "Креативити" ЕООД		М3.5	311	ОПРЧР	Частен сектор		
Разкриване на нови работни места в "АВТОЕКСПЕРТ ПЛЮС" ЕООД - гр. Велико Търново		М3.5	128	ОПРЧР	Частен сектор		
Нови работни места в „АЛРО-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД		М3.5	162	ОПРЧР	Частен сектор		
Нова възможност за нови работни места във "Вимар" ООД		М3.5	158	ОПРЧР	Частен сектор		
СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА И ОСИГУРЯВАНЕ ДОСТЪП ДО ЗАЕТОСТ ЗА ЕФЕКТИВНО РАЗРАСТВАНЕ В ДЪРВООБРАБОТВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ "И М К ФОРЕСТ КОМЕРС" ЕООД		М3.5	61	ОПРЧР	Частен сектор		
Създаване на нови работни места за професионална реализация в "Траймис Къмпани" ООД		М3.5	59	ОПРЧР	Частен сектор		
Създаване на устойчива заетост в сферата на ресторантьорството и хетъринговата дейност		М3.5	88	ОПРЧР	Частен сектор		
НАСЪРЧАВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И РАЗКРИВАНЕ НА "ЗЕЛЕНИ" РАБОТНИ МЕСТА В СТАРУМ ЕООД ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ		М3.5	64	ОПРЧР	Частен сектор		
Ремонт на покрив в СОУ "Владимир Комаров"		М3.7	48	Общински бюджет	Община Велико Търново		
Смяна на дограма в Спортно училище, Велико Търново		М3.7	15	Общински бюджет	Община Велико Търново		
Реконструкция и модернизация ЦДГ "Ален мак"		М3.7	36	Общински бюджет	Община Велико Търново		
Ремонт покрив СОУ "Вл. Комаров" 2 етаж		М3.7	48	Общински бюджет	Община Велико Търново		
Основен ремонт на санитарни вълзи ПМГ "Васил Друмев"		М3.7	21	Общински бюджет	Община Велико Търново		

Наименование на проекта/договора	Съответствие с проект от ОПР	Принос към ОПР	Стойност на проекта /кв. лв./	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Огворник/Бенефициент	Партньори	Година		
							14	15	16
Основан ремонт на санитарни възли ЕГ "Проф.д-р А.Златаров"		М3.7	69	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Основан ремонт на санитарни възли в ЦДГ "Първи юни"		М3.7	49	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Преустройство на помещения - Спортно училище		М3.7	21	Общински бюджет	Община Велико Търново				
СОУ Емилиян Станев - система за видеонаблюдение		М3.7	2	Общински бюджет	Община Велико Търново				
ОУ "Димитър Благоев" - Пожарозвестителна система и видеонаблюдение		М3.7	7	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Оборудване за образователна инфраструктура - 2014		М3.7	103	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Оборудване за образователна инфраструктура - 2015		М3.7	24	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Оборудване за образователна инфраструктура - 2016		М3.7	10	Общински бюджет	Община Велико Търново				
ОУ "Бачо Киро" - изграждане на спортна площадка за мултиспорт		М3.7	39	Общински бюджет	Община Велико Търново				
ОУ "Бачо Киро" - изграждане на детска площадка		М3.7	76	Общински бюджет	Община Велико Търново				
ОУ "Бачо Киро" - благоустр. на училищния двор		М3.7	22	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Ученическо общежитие към Спортно училище ВТ - преустройство на помещения в три броя класни стаи със санитарни възли		М3.7	19	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Основан ремонт санитарни помещения СУ "Вела Благоева"		М3.7	35	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Реконструкция и модернизация ЦДГ "Ален мак" 2 етап		М3.7	22	Общински бюджет	Община Велико Търново				

Наименование на проекта/договора	Съответствие с проект от ОПР	Принос към ОПР	Стойност на проекта /хил. лв./	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Отговорник/ Бенефициент	Партньори	Година		
							14	15	16
Обновяване на детски площадки на детски градини и ясли		МЗ.7	26	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Внедряване мерки за енергийна ефективност в образователната структура - СОУ "Вела Благоева", СОУ "Владимир Комаров", ЦДГ "Първи Юни", ОУ "Христо Ботев" с. Ресен, ОУ "Христо Смирненски" с. Водoley		МЗ.7	31	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Изграждане на газова инсталация и газификация на котелното помещение в СОУ "Вела Благоева" гр. Велико Търново		МЗ.7	70	Общински бюджет	Община Велико Търново				
ДЯ "Слънце" - климатични инсталации		МЗ.7	4	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Текущи ремонти дейности в кухненските блокове и яслните групи на следните обекти: Детска ясла "Щастливо детство", Детска ясла "Мечо Пух-3", детска ясла "Слънце" гр. Велико Търново и Детска ясла "Зорница", гр. Дебелец		МЗ.7	36	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Ремонт на покривна конструкция, саниране на сградата и подмяна на отоплителната инсталация на Детска ясла "Мечо Пух- 3"		МЗ.7	184	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки в училищата		МЗ.7	23	Национална Програма "Осигуряване на съвременна образователна среда"	Община Велико Търново				
Въвеждане на информационни и комуникационни технологии в образователни обекти, вкл. закупуване на оборудване и програмни продукти		МЗ.7	167	Общински бюджет - 162 Еразъм+ - 5	Община Велико Търново				
Придобиване на стопански инвентар за образователни обекти - 2014		МЗ.7	6	Общински бюджет Държавен бюджет - 3	Община Велико Търново				

Наименование на проекта/договора	Съответствие с проект от ОПР	Принос към ОПР	Стойност на проекта /мл. лв./	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Отговорник/ Бенефициент	Партньори	Година		
							14	15	16
Придобиване на стопански инвентар за образователни обекти - 2015		M3.7	18	Общински бюджет - 12 Държавен бюджет - 5 Еразъм+ - 1	Община Велико Търново				
Придобиване на стопански инвентар за образователни обекти - 2016		M3.7	3	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Изграждане на спортна площадка в ЦДГ Здравец		M3.7	5	ПУДОС	Община Велико Търново				
Задължителни дейности във връзка с изпълнението на проект за енергийна ефективност ЦДГ Соня		M3.7	68	Държавен бюджет - 35 Приватизация - 33	Община Велико Търново				
Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ЦДГ „Соня“ и ЦДГ „Ивайло“		M3.7	413	Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.	Община Велико Търново				
Ремонтни дейности на ЦДГ в село Церова Кория		M3.7	30	Програмата за хуманитарна и гражданска помощ на САЩ	Община Велико Търново				
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ РЕСУРСИ И ПРОДУКЦИЯ									
Изработване на проект за канализация на с. Беляковец		M4.1	12	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Проектно проучване за пречиствателна станция за битови отпадъчни води за 1000 ЕЖ на с. Присово		M4.1	6	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Дебелец		M4.2	365	ПУДОС	Община Велико Търново				

Наименование на проекта/договора	Съответствие с проект от ОПР	Принос към ОПР	Стойност на проекта /хил. лв./	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Отговорник/ Бенефициент	Партньори	Година		
							14	15	16
Закриване и реконструкция на Дяло за твърди битови отпадъци гр. Килифарезо		M4.2	265	ПУДООС	Община Велико Търново				
Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради		M4.6	1 782	НПЕЕМЖС	Сдружения на собственици				
Изпълнение на годишна програма за управление и разпореджане с общинска собственост и придобиване на ново общинско имущество		M4.12		Общински бюджет	Община Велико Търново				
Изработване на горскостопански план на горите, собственост на Община Велико Търново		M4.13	26	Общински бюджет	Община Велико Търново				
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ НАСЛЕДСТВО И ТУРИЗЪМ									
Проект „Дигитална културна съкровищница “Север +” за дигитализиране на архива на кийн на общината		M5.1		Общински бюджет	Община Велико Търново	НРБ			
Реализиране на партньорства в областта на културата между Община Велико Търново и културни институции/оператори		M5.1		Общински бюджет	Община Велико Търново				
Създаване на обществен съвет за защита на културното наследство		M5.4		Общински бюджет	Община Велико Търново				
Фасадна реставрация, ремонтно –възстановителни работи и цветово решение на 14 сгради от ансамбъла ул. “Ст.Стамболов”		M5.5	1	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Фасадна реставрация, ремонтно –възстановителни работи и цветово решение на 8 сгради от ансамбъла ул. “Велчо Джамджията” и на 15 сгради от ансамбъла ул. “Ст.Стамболов”		M5.5		Общински бюджет	Община Велико Търново				
Художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, владичкия трон и проскинитария от църква „Рождество Пр. Богородица”, с. Плаково		M5.6	55	Държавен бюджет	Община Велико Търново				
Художествена консервация и реставрация на 14кв.м. стенописи на Захари Зограф в църквата “Св.Преображение Господне” в Преображенския манастир		M5.6	13	Общински бюджет	Община Велико Търново				

Наименование на проекта/договора	Съответствие с проект от ОПР	Принос към ОПР	Стойност на проекта /хил. лв./	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Отговорник/ Бенефициент	Партньори	Година		
							14	15	16
Художествена консервация и реставрация на иконостаса и иконите на църквата „Рождество Пр.Богородица“ в с.Плаково		M5.6	34	Общински бюджет	Община Велико Търново				
СБ - нестложки аварийно- възстановителни работи на храм "Св. Богородица" с. Русая		M5.6	65	Държавен бюджет	Община Велико Търново				
СБ - нестложки аварийно- възстановителни работи на храм "Св. Ирина" с. Хотница		M5.6	26	Държавен бюджет - 25 Общински бюджет - 1	Община Велико Търново				
СБ - нестложки аварийно- възстановителни работи на храм "Св. Богородица" с. Русая 2 етап		M5.6	3	Държавен бюджет - 2 Общински бюджет - 1	Община Велико Търново				
Изложбени зали "Рафаел Михайлов" - подмяна на външната дограма с РУС стъклопакети		M5.7	3	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Изложбени зали "Рафаел Михайлов" - ремонт		M5.7	24	Общински бюджет - 4 Приватизация - 20	Община Велико Търново				
Провеждане на културни събития в ДКС "В. Левски"		M5.7	253	Общински бюджет	Община Велико Търново				
финансиране на 10 проекта по Програма „ Изкуство и култура” - 2014		M5.7	50	Общински бюджет	Община Велико Търново				
финансиране на 7 проекта по Програма „ Изкуство и култура” -2015		M5.7	37	Общински бюджет	Община Велико Търново				
финансиране на 5 проекта по Програма „ Изкуство и култура” - 2016		M5.7	29	Общински бюджет	Община Велико Търново				
Доразвитие на местните и регионални туристически продукти, включително установените маршрути		M5.8		Общински бюджет	Община Велико Търново				
Основен ремонт екопътека с. Хотница		M5.8	10	Общински бюджет	Община Велико Търново				

Наименование на проекта/договора		Съответствие с проект от ОПР	Принос към ОПР	Стойност на проекта /хил. лв./	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Отговорник/Бенефициент	Партньори	Година
								14 15 16
Провеждане на културни събития и дейности в открити публични пространства - парк "Марно поле", парк "Майна България", парк "Асеневиц", крепостта Царевец, летния театър и в ателиетата на Самоводската чаршия, двора на църквата-музей "Св. Димитър Солунски"			M5.9	566	Общински бюджет	Община Велико Търново		
Провеждане на изложението "Културен туризъм"			M5.10		Общински бюджет	Община Велико Търново		
Оптимизиране работата на общинското предприятие „Царевград Търнов“ ЕООД. Увеличаване на предоставяните туристически услуги			M5.10		Общински бюджет	Община Велико Търново		
Модерен център за интерпретация на културното наследство, Хълм "Трапезица"			M5.12	7	Общински бюджет	Община Велико Търново		
Функциониране на Областен информационен център - Велико Търново			-	315	ОПДУ	Община Велико Търново		
Създаване на обществено-експертен съвет по култура			M6.7		Общински бюджет	Община Велико Търново		
ОЦЕНЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ								
„Изграждане на Кризисен център за лица“ BG16RFOP001-1.001-39 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” BG16RFOP001-1.009-0002-C01		П3.7	M3.3	2 169	ОПРР	Община Велико Търново		
„Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“ BG16RFOP001-1.001-39 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” BG16RFOP001-1.009-0003-C01		П1.12	M1.2	2 000	ОПРР	Община Велико Търново		

Наименование на проекта/договора	Съответствие с проект от ОПР	Принос към ОПР	Стойност на проекта /хил. лв./	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Отговорник/ Бенефициент	Партньори	Година		
							14	15	16
„Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ BG16RFOP001-1.001-39 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ BG16RFOP001-1.009-0004-C01	П1.7 П1.9 П1.19 П1.28 П3.28 П5.16	M1.5	11 010	ОПРР	Община Велико Търново				
„Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ BG16RFOP001-1.001-39 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ BG16RFOP001-1.009-0001	П3.57	M3.7	8 699	ОПРР	Община Велико Търново				
„Обществена трапезария – Велико Търново“	П3.8	M3.4	43	Държавен бюджет	Община Велико Търново				
ПРОЕКТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОЦЕНКА									
Модели за съвместно управление на риска за градове в трансграничния регион Румъния – България		M5.3	5 310	Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ - 4 514 Национално съфинансиране - 690 Собствено съфинансиране - 106	Община Велико Търново	Администрацията на регион Долж-Румъния, Инспекторат за реакция при кризи „Олтения“ на регион Долж, Румъния Фондация „Партньори за устойчиво развитие“, България			

Наименование на проекта/договора	Съответствие с проект от ОПР	Принос към ОПР	Степеност на проекта /мл. лв./	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Отговорник/Бенефициент	Партньори	Година		
							14	15	16
FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти.		M4.8	754	„INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ - 641 Национално съфинансиране - 98 Собствено съфинансиране - 15	Община Велико Търново	Двустранна България – Румънска Търговска Камара, България Национален Театър на Крайова, Румъния Евроскоп – НПО, София, България Ателиерул – НПО, Букурещ, Румъния			
Трансграничен регион Румъния-България - Подкрепа на училища/детски заведения за деца със специални потребности/		M3.7	1 445	„INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ - 1 228 Национално съфинансиране - 188 Собствено съфинансиране - 29	Областен съвет на Телеорман, Румъния	Община Велико Търново			

Наименование на проекта/договора	Съответствие с Проект от ОПР	Принос към ОПР	Стойност на проекта /мл. лв./	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Отговорник/ Бенефициент	Партньори	Година		
							14	15	16
"Учения за бъдещето в трансграничния регион – модел за сътрудничество между Велико Търново и Александрия". Беляковец	П2.53	-	1 084	"INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г." - 921 Национално съфинансиране - 141 Собствено съфинансиране - 22	Община Александрия, окръг Телеорман	Община Велико Търново, България Технически университет, Александрия, Румъния Фондация "Партньори за устойчиво развитие", България			
По-добра интеграция на трансграничния регион чрез заетост и привлекателна среда за инвестиции		M4.11	217	"INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г." - 185 Национално съфинансиране - 28 Собствено съфинансиране - 4	Община Велико Търново	Търговско – промишлена палата на Телеорман, Румъния			
Интегрирана система за мониторинг на околната среда, ранно откриване и превенция от природни бедствия		-	4 696	"INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г." - 3 992 Национално съфинансиране - 610 Собствено съфинансиране - 94	Областен съвет на Телеорман, Румъния	Областна администрация Велико Търново, България Община Велико Търново, България			
Система "Обучения и заетост за младите хора" – етап 2	П3.31	M3.4		ОПРЧР	Община Велико Търново	Агенция по заетостта			

Наименование на проекта/договора	Съответствие с проект от ОПР	Принос към ОПР	Стойност на проекта /хил. лв./	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Отговорник/ Бенефициент	Партньори	Година		
							14	15	16
Схема „Обучения и заетост“ – етап 2	П3.38	М3.4		ОПРЧР	Община Велико Търново	Агенция по заетостта			
Адаптиране и обособяване на помещението част от административната сграда на Дом за стари хора „Венета Ботева“ в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в град Велико Търново		М3.3	103	Красива България	Община Велико Търново				
Древни крепости и пътища по поречието на Дунав: остойносттаване и защита на общото природно и културно наследство в трансграничната област	П5.21	М5.11	4 668	„INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ - 3 968 Национално съфинансиране - 607 Собствено съфинансиране - 93	Община Велико Търново	Община Александрия, Румъния, Фондация „Партньори за устойчиво развитие“, България			
